


# 工程成本進度


工程名稱	正覺寺玄奘文化宗教園區開發案
開工日期	112年07月21日
預定完工日期	115年10月08日
施工工期	1170日曆天+展延工期6天
累計工期	518日曆天（截至113年12月19日）
剩餘工期	662日曆天
預定進度(113.12.19)	26.50%
實際進度(113.12.19)	25.32%
本週進度(超前/落後)	1.18%

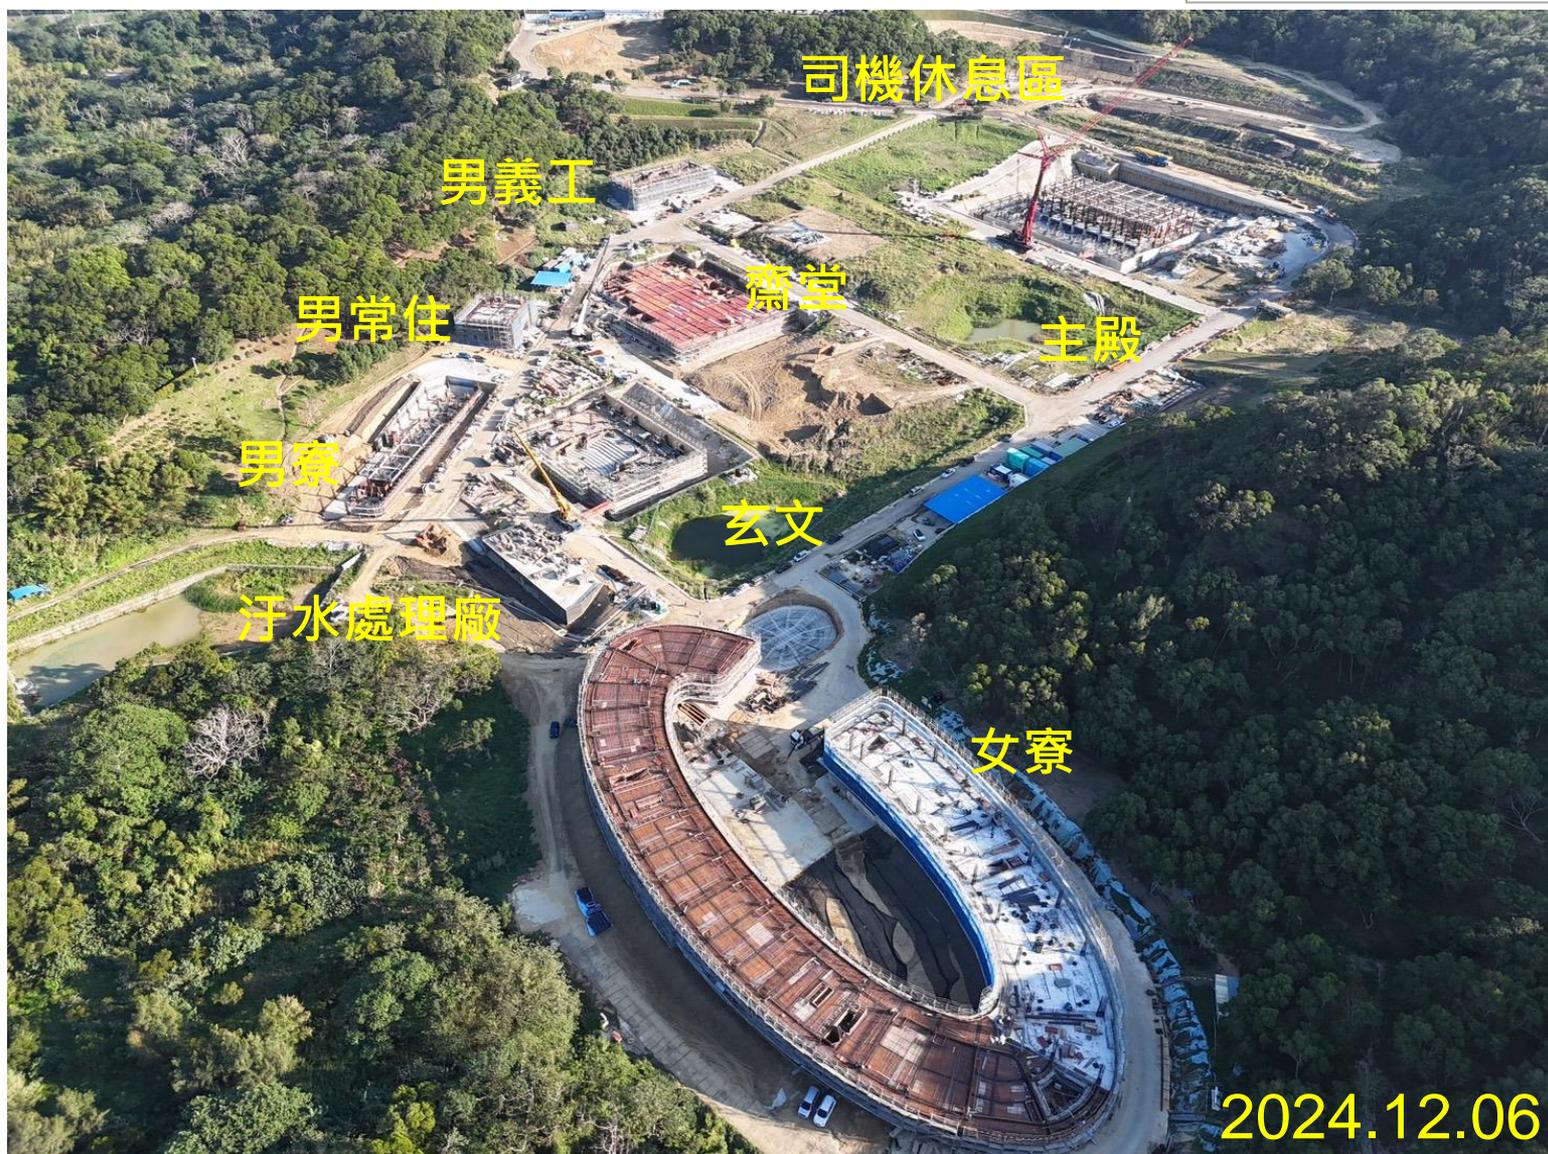


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案



## 施工照片

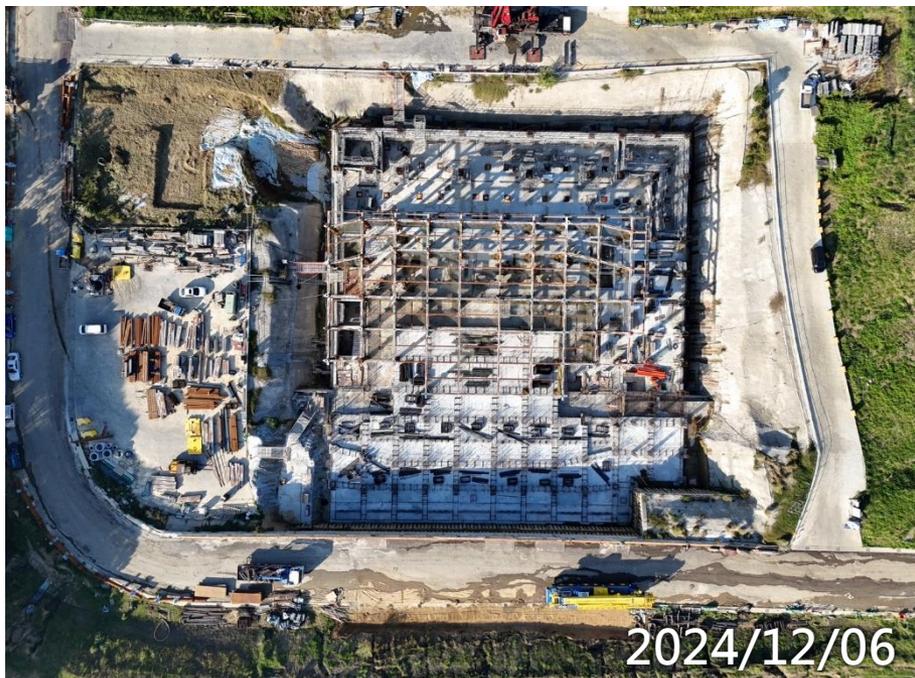

主殿

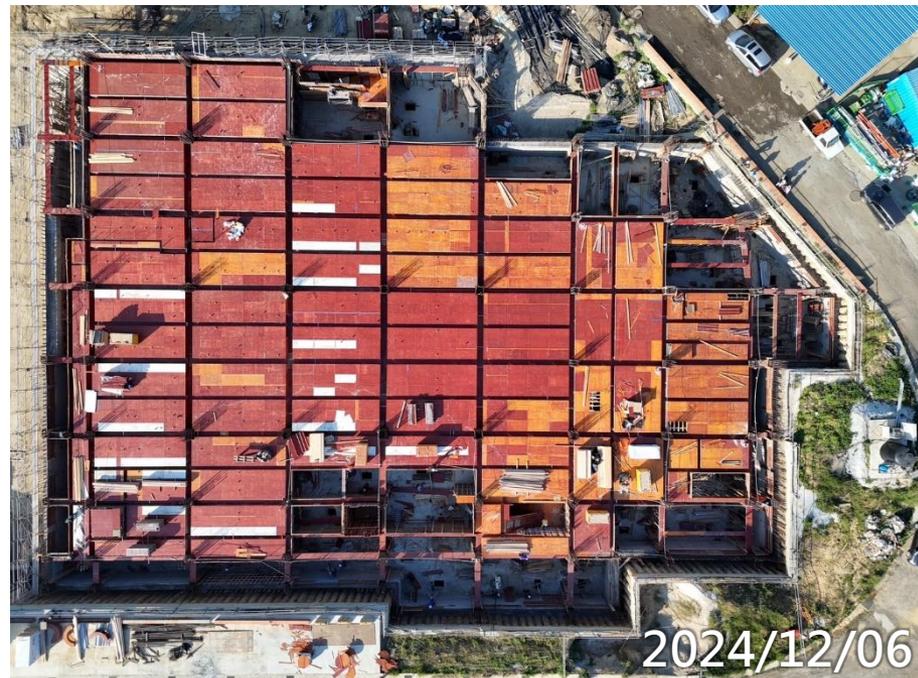


齋堂

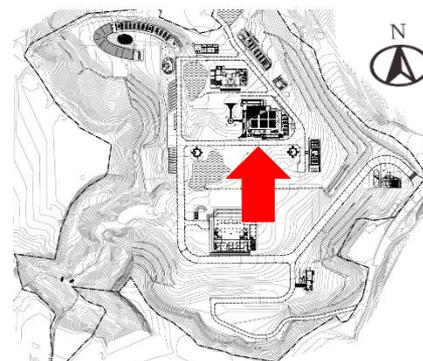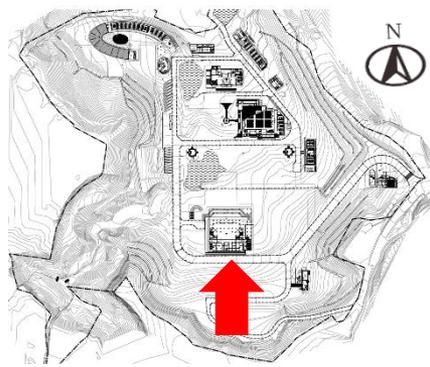

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案



## 施工照片

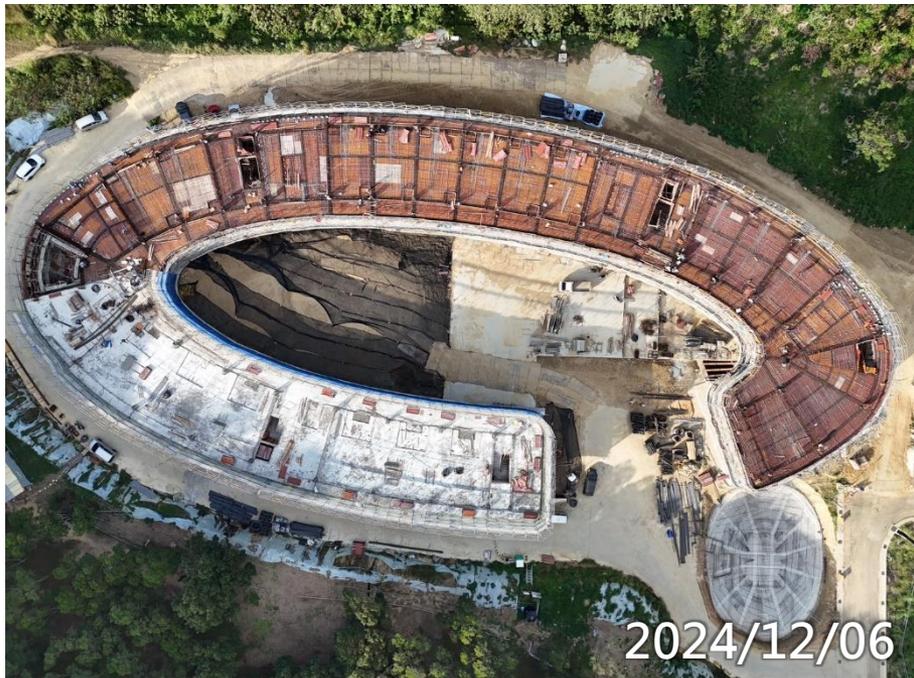

女寮



玄文

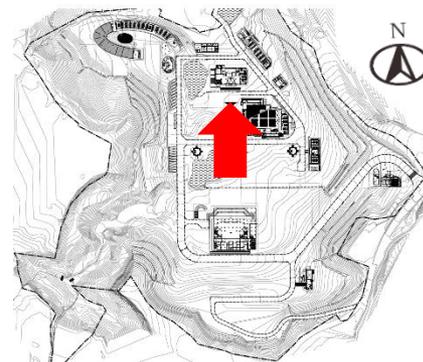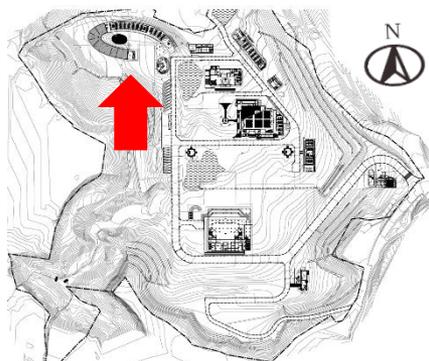


# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案



## 施工照片



男義工

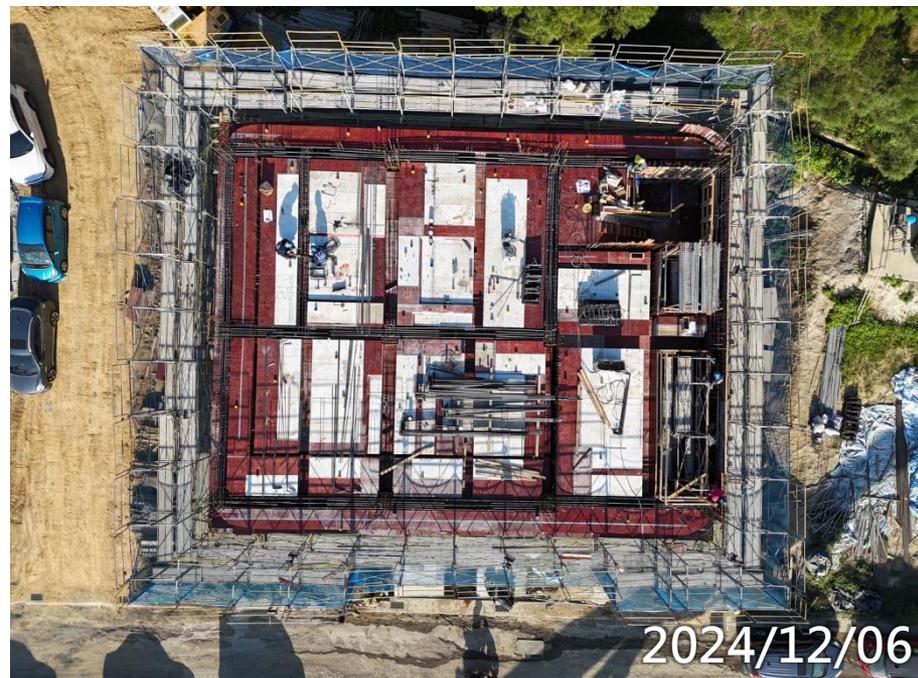

男常住

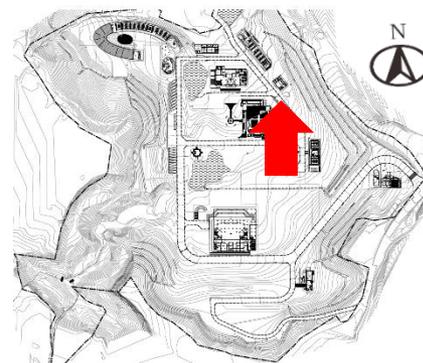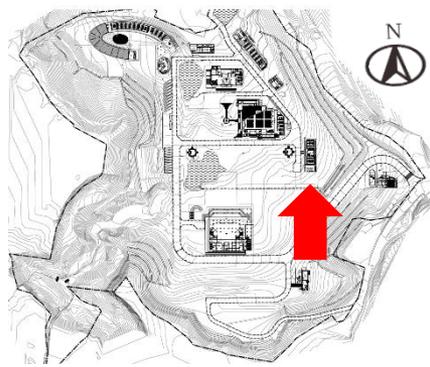

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案



## 施工照片




男寮




司機休息室

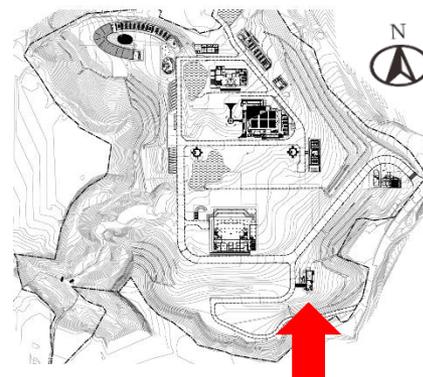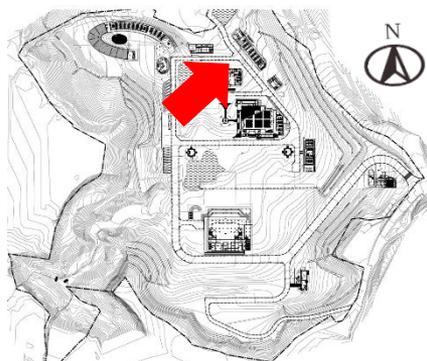

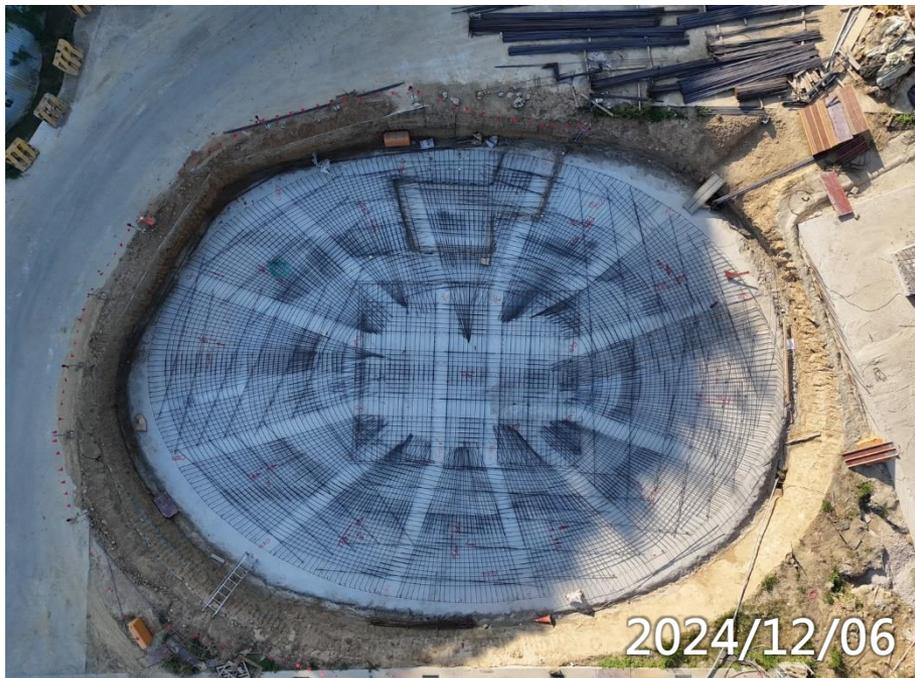

女常住

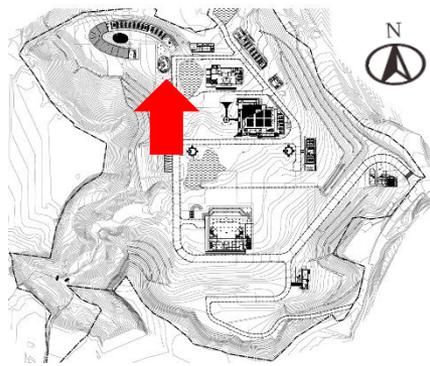


# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



主殿全版區鋼構吊裝

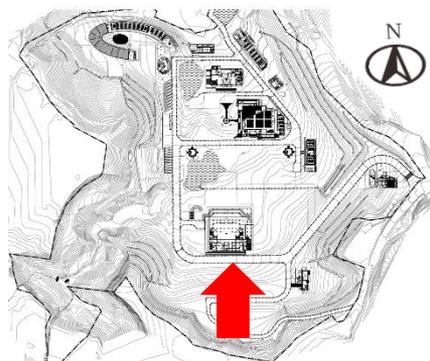


齋堂1F柱牆、2F梁版鋼筋模板水電施作

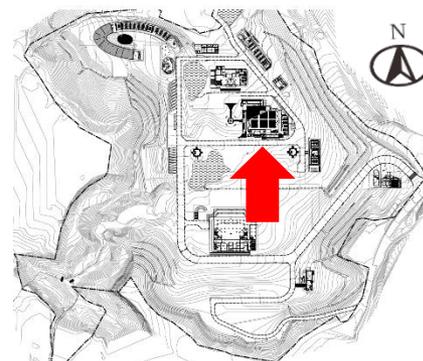



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片

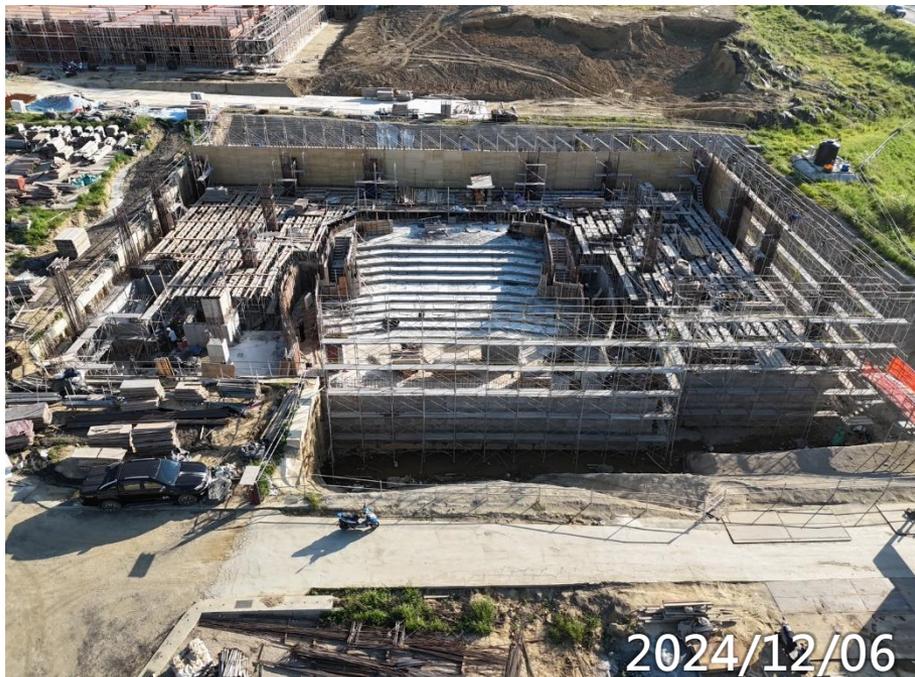

玄文B1F柱牆鋼筋模板水電施作

女寮2F柱牆3F梁版鋼筋模板水電施作

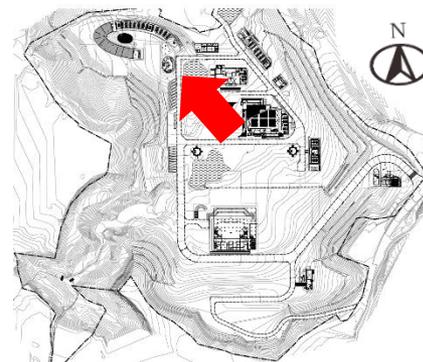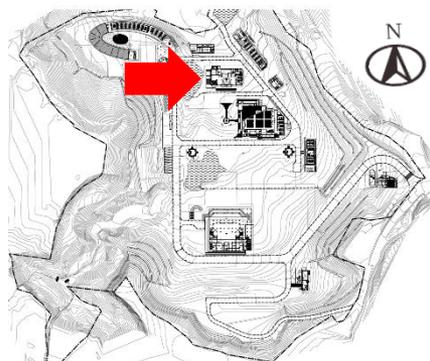



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片




男寮B1F柱牆鋼筋模板水電施作

男義工2F柱牆鋼筋模板水電施作

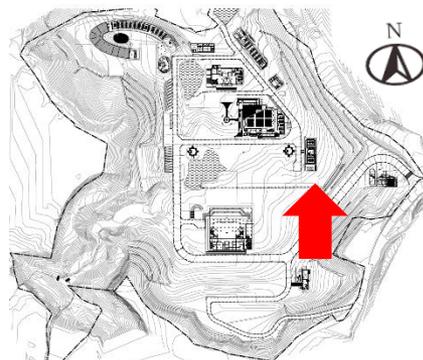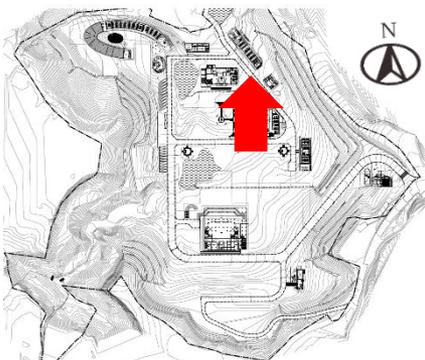




男常住3F梁版鋼筋模板水電施作

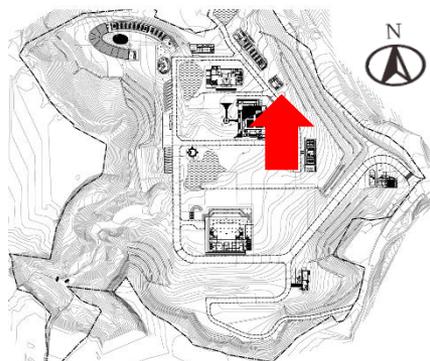


司機休息室1F柱牆鋼筋模板水電施作

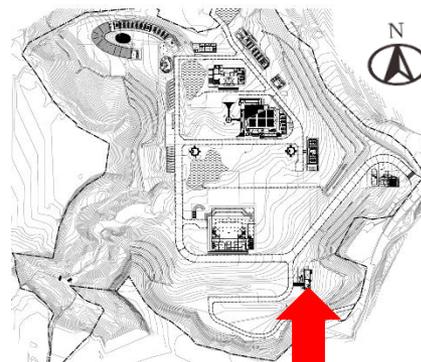



女常住基礎層鋼筋施作

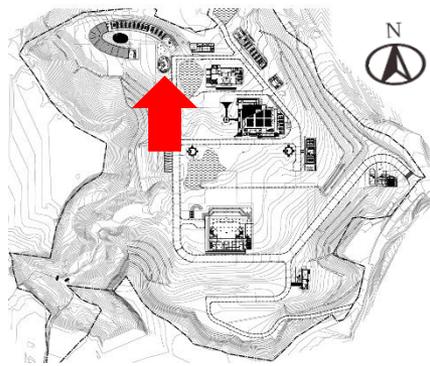




### 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景




主殿



全區B1F至2F鋼構吊裝

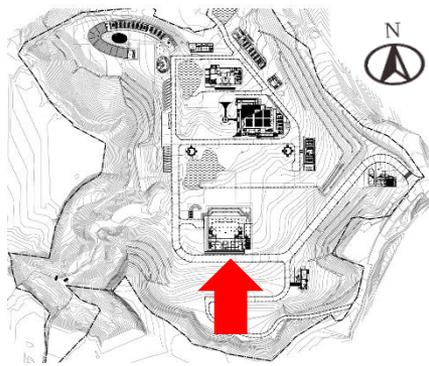


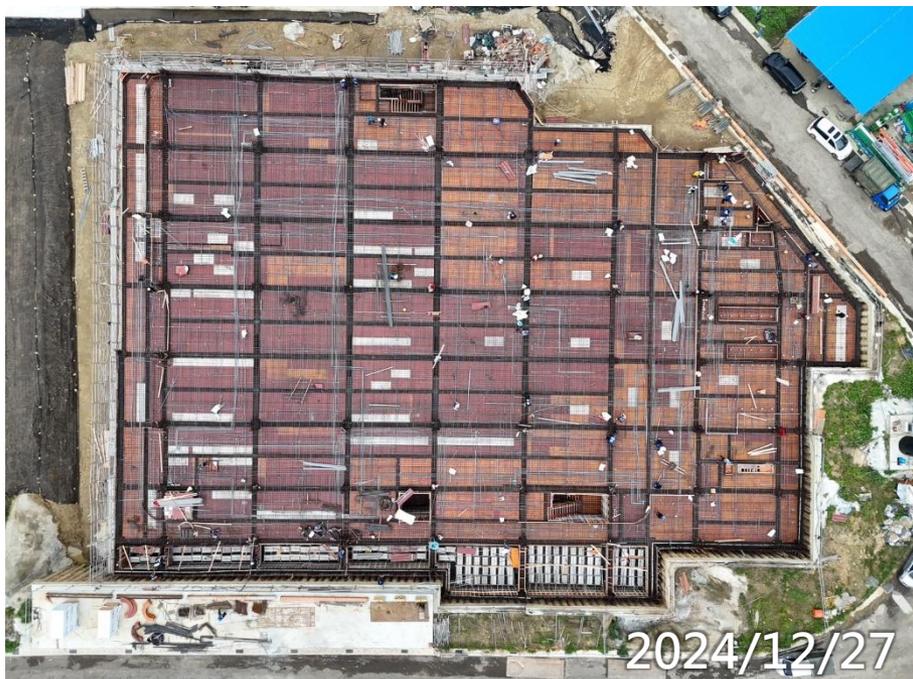

齋堂



齋堂1F柱牆2F梁版施作

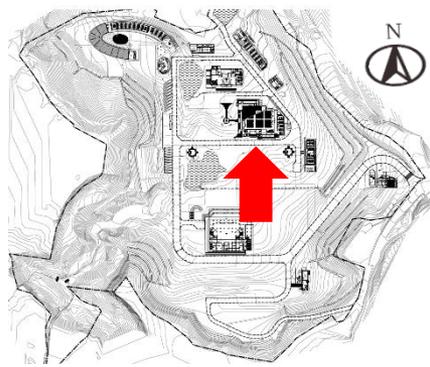

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



玄文



玄文B1F柱牆1F梁版施作

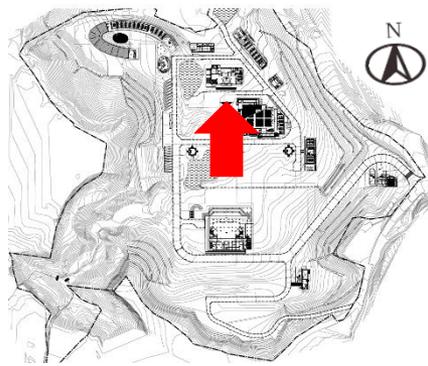

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



女寮



女寮3F柱牆施作

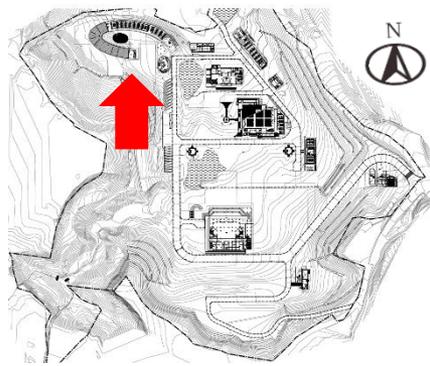

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片




女常住



女常住筏基層施作

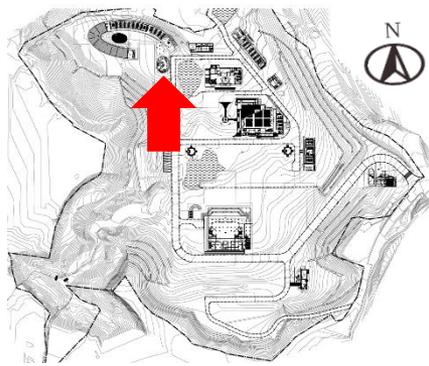


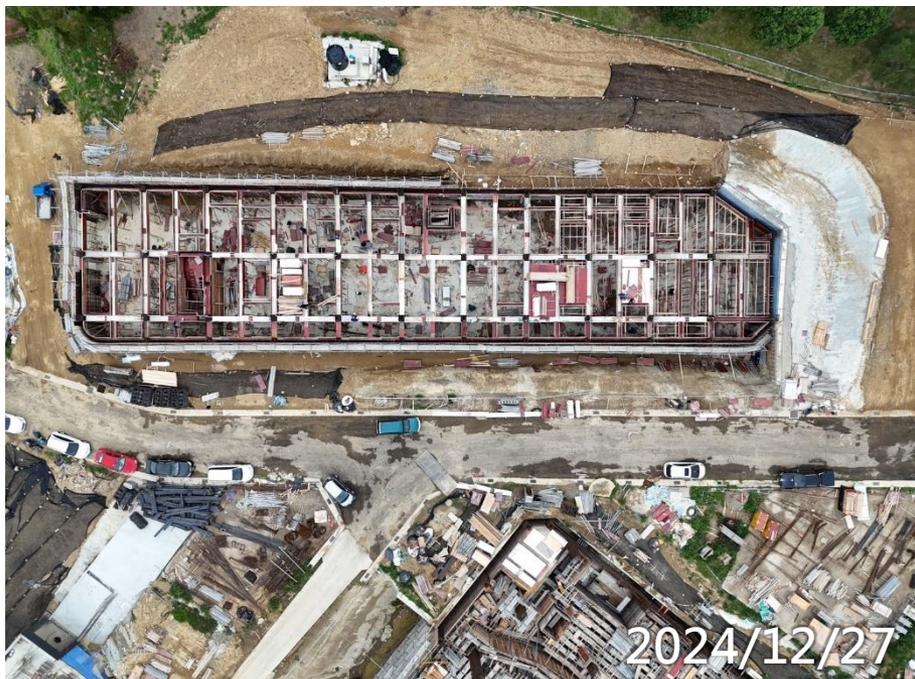

男寮



男寮B1F柱牆1F梁版施作

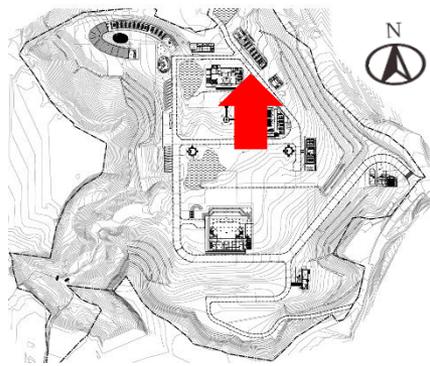

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



男義工




男義工2F柱牆3F梁版施作

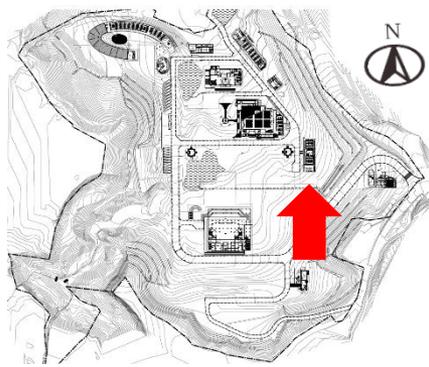

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片

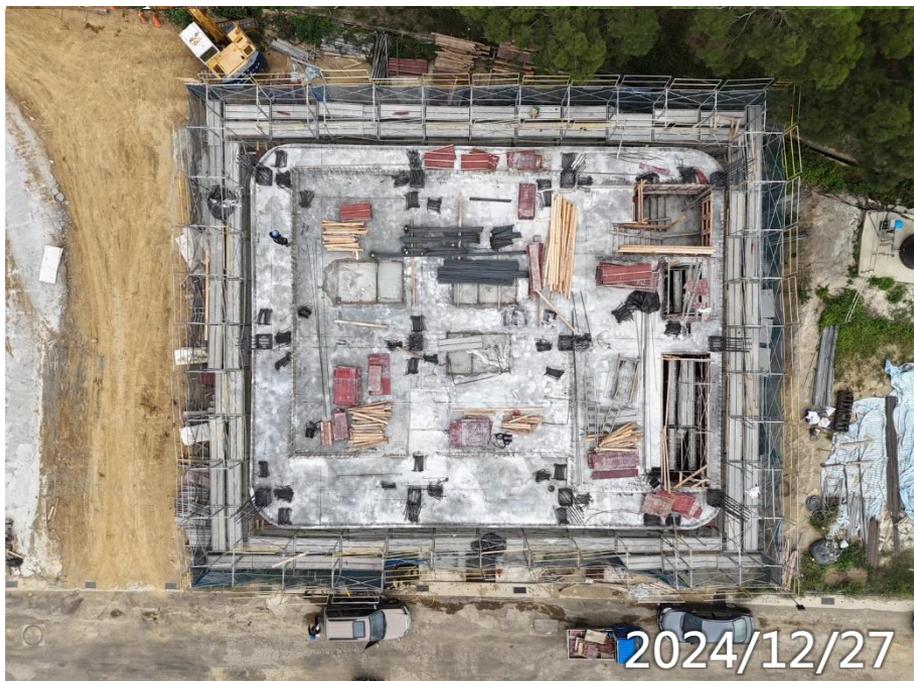

男常住



男常住3F柱牆施作

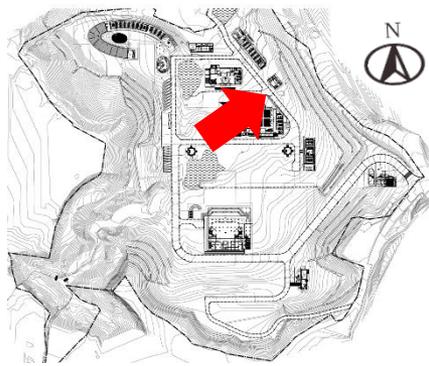

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

## 施工照片



司機休息室



司機休息室1F柱牆2F梁版施作

