

# 工程成本進度

工程名稱	正覺寺玄奘文化宗教園區開發案
開工日期	112年07月21日
預定完工日期	115年10月08日
施工工期	1170日曆天+展延工期6天
累計工期	546日曆天（截至114年01月16日）
剩餘工期	630日曆天
預定進度(114.01.16)	27.87%
實際進度(114.01.16)	27.68%
本週進度(超前/落後)	0.19%



正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



主殿



全區B1F至2F鋼構吊裝校正  
低版區B1F柱牆1F梁版模板施作  
高版區地梁鋼筋施作

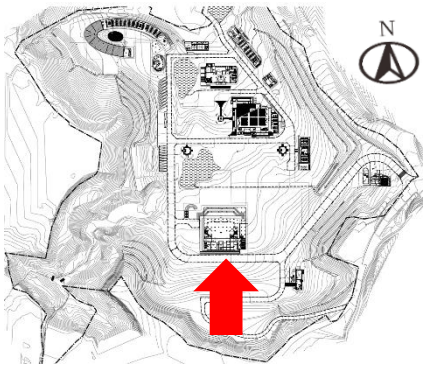

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



齋堂



齋堂1F柱牆2F梁版澆置

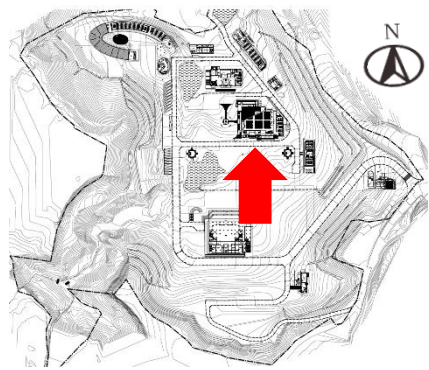

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



玄文



玄文B1F柱牆1F梁版施作

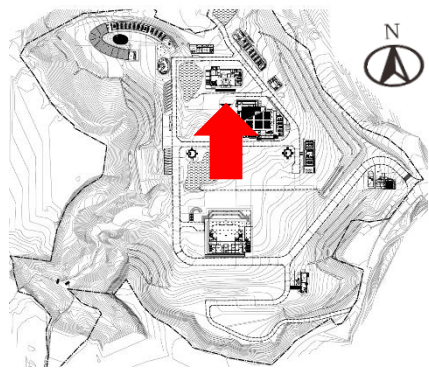

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



女寮




女寮3F柱牆4F梁版施作

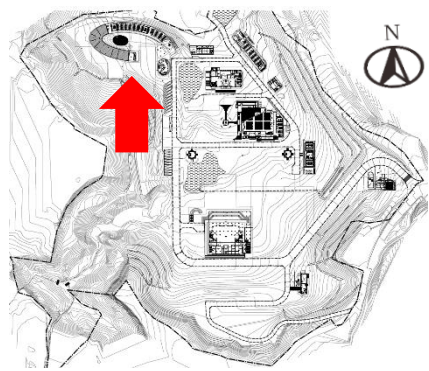

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片

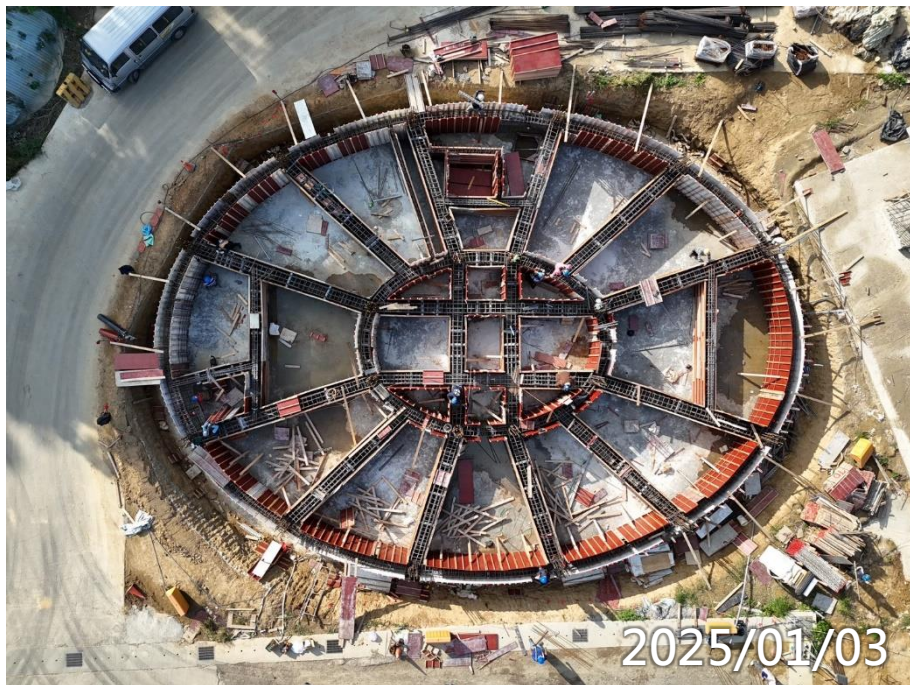

女常住



女常住筏基層施作

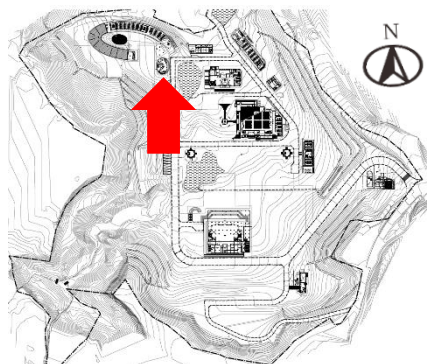




男寮



男寮B1F柱牆1F梁版施作

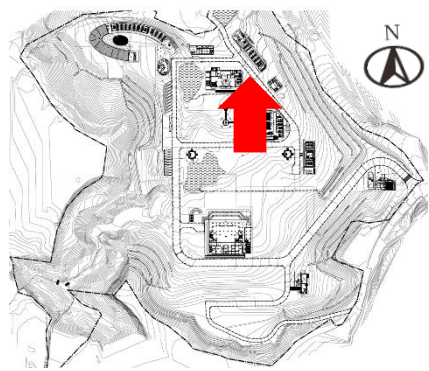



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



男義工



男義工3F柱牆施作

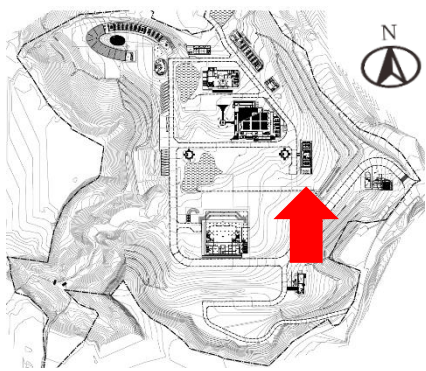




男常住



男常住3F柱牆施作

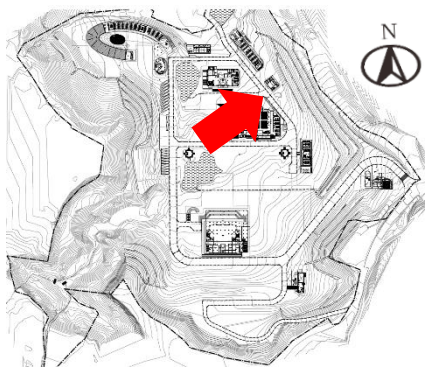

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



司機休息室



司機休息室1F柱牆2F梁版施作

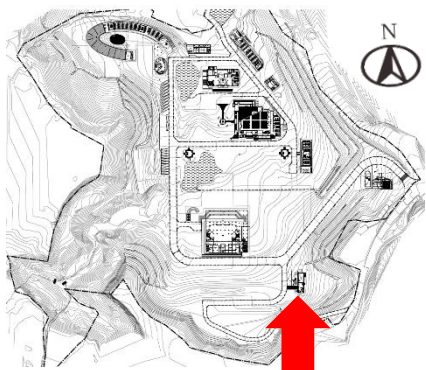




### 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景



主殿



全區B1F至2F鋼構吊裝校正  
車道及高版區地梁鋼筋水電施作  
低版區1F梁版鋼筋模板施作

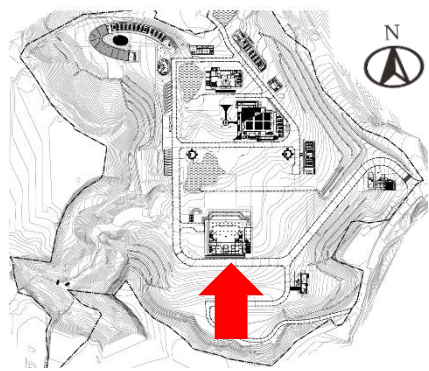




齋堂



齋堂2F柱牆施作

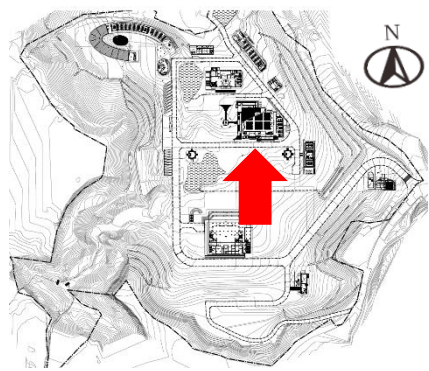

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



玄文



玄文1F梁版澆置

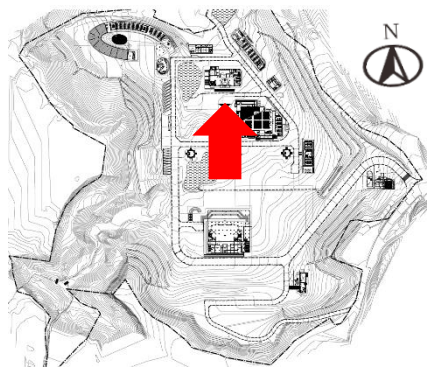




女寮



女寮3F柱牆4F梁版澆置(南區)  
3F柱牆4F梁版施作(北區)

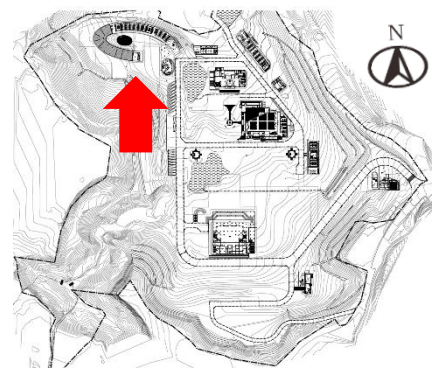






女常住



女常住基礎層施作

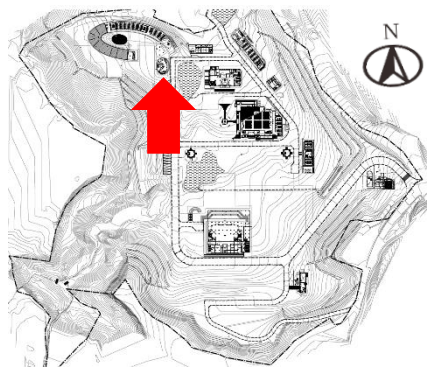




男寮



男寮B1F外牆拆模  
鋼軌樁樁帽打除

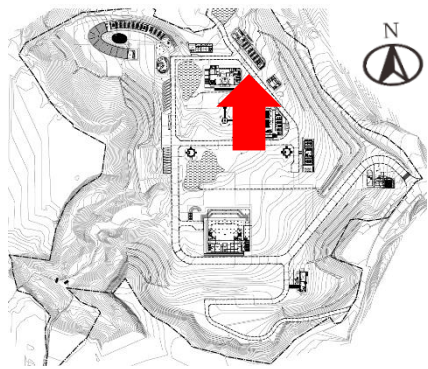

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



男義工



男義工3F柱牆RF梁施作

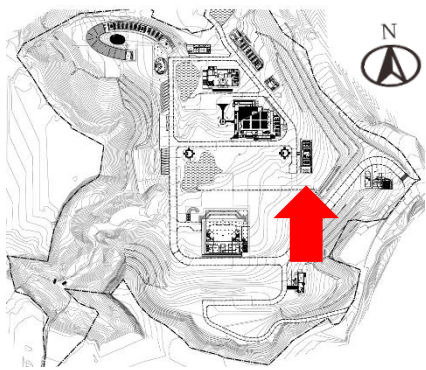

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


## 施工照片



男常住



男常住3F柱牆RF梁施作

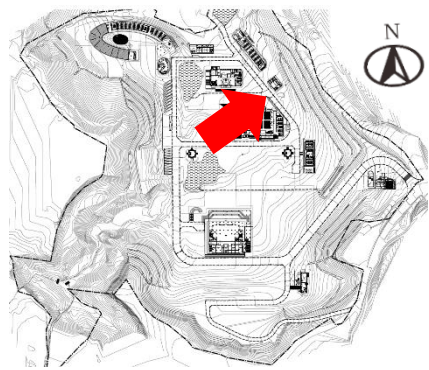

# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

施工照片



司機休息室



司機休息室2F柱施作

