

工程成本進度

工程名稱	正覺寺玄奘文化宗教園區開發案
開工日期	112年07月21日
預定完工日期	115年10月08日
施工工期	1170日曆天+展延工期6天
累計工期	546日曆天（截至114年01月16日）
剩餘工期	630日曆天
預定進度(114.01.16)	27.87%
實際進度(114.01.16)	27.68%
本週進度(超前/落後)	0.19%



正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



主殿



全區B1F至2F鋼構吊裝校正
低版區B1F柱牆1F梁版模板施作
高版區地梁鋼筋施作

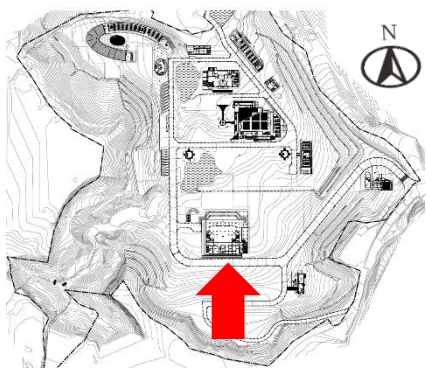

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



齋堂



齋堂1F柱牆2F梁版澆置

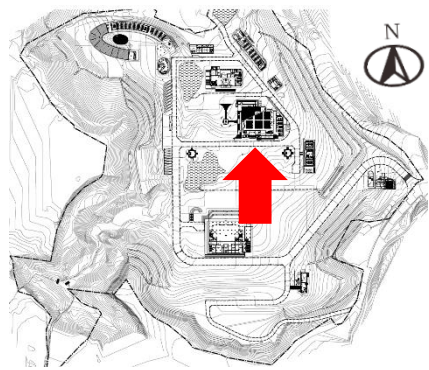

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



玄文



玄文B1F柱牆1F梁版施作

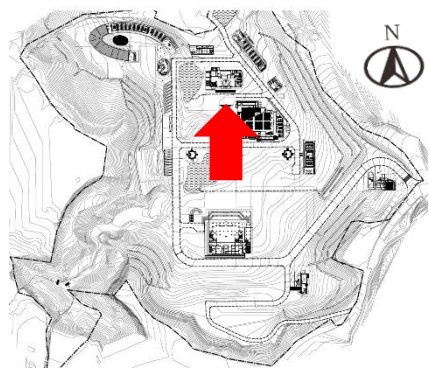

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



女寮



女寮3F柱牆4F梁版施作

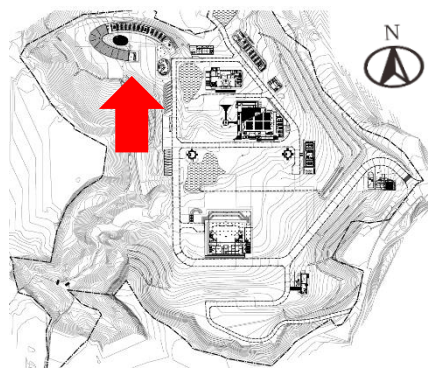




女常住



女常住筏基層施作

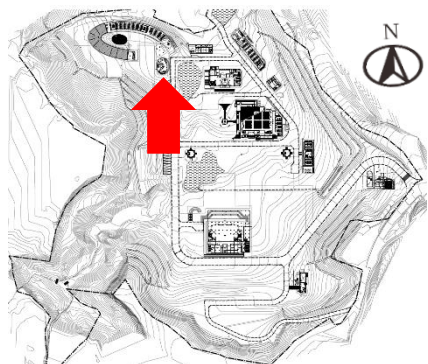




男寮



男寮B1F柱牆1F梁版施作

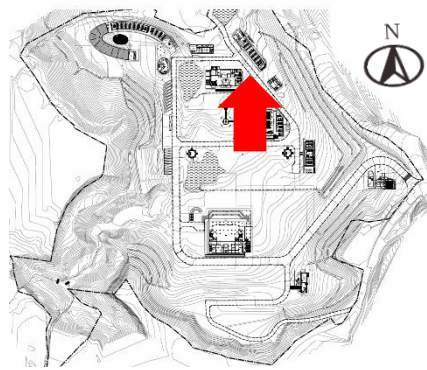

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



男義工



男義工3F柱牆施作

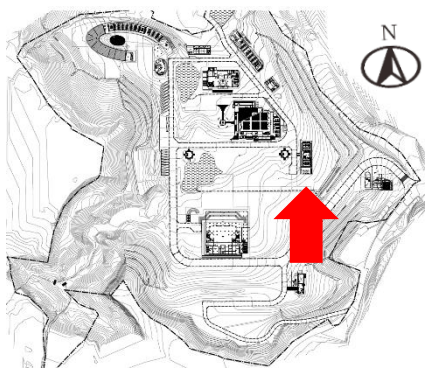




男常住



男常住3F柱牆施作

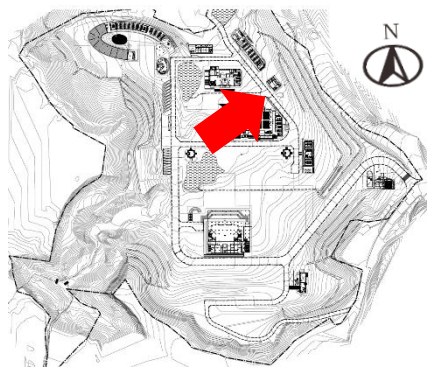

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



司機休息室



司機休息室1F柱牆2F梁版施作

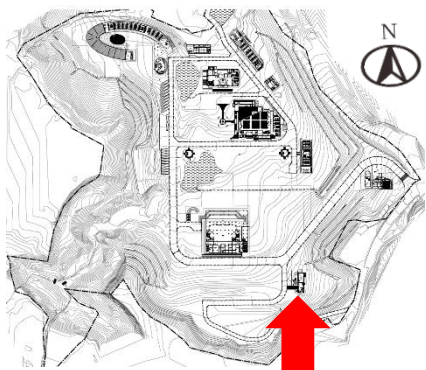




正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景



主殿



全區B1F至2F鋼構吊裝校正
車道及高版區地梁鋼筋水電施作
低版區1F梁版鋼筋模板施作

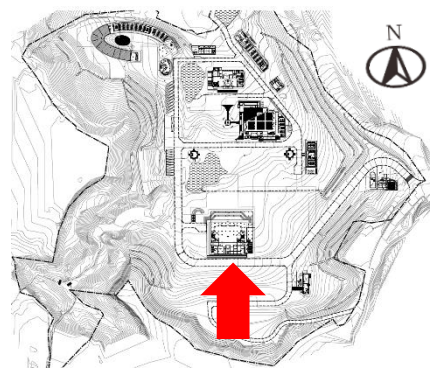




齋堂



齋堂2F柱牆施作

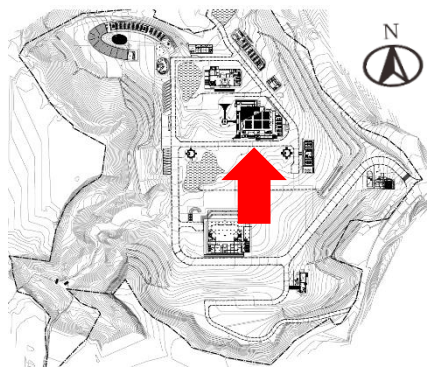

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



玄文



玄文1F梁版澆置

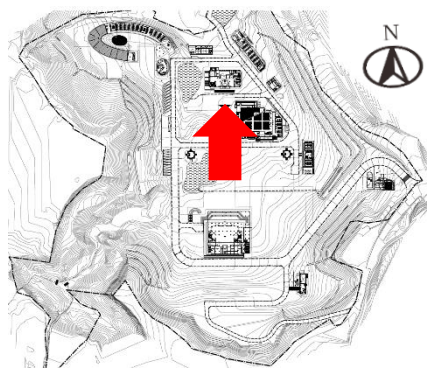




女寮



女寮3F柱牆4F梁版澆置(南區)
3F柱牆4F梁版施作(北區)

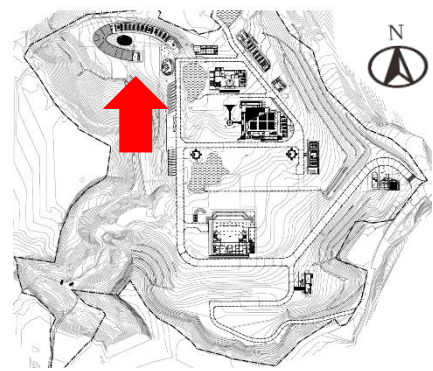




女常住



女常住基礎層施作

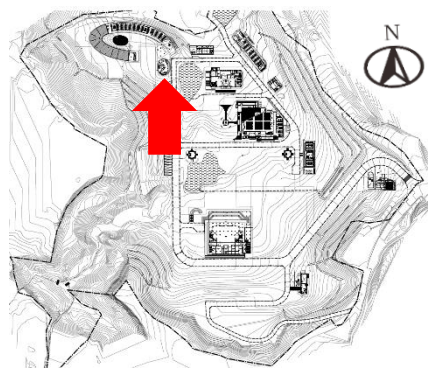




男寮



男寮B1F外牆拆模
鋼軌樁樁帽打除

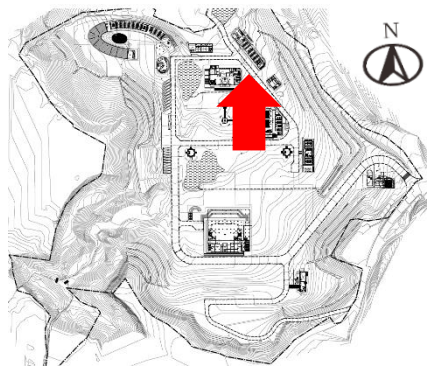

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



男義工



男義工3F柱牆RF梁施作

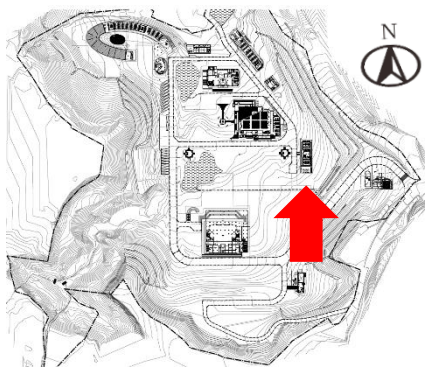

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案


施工照片



男常住



男常住3F柱牆RF梁施作

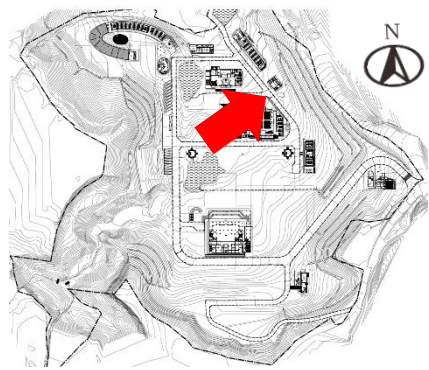



司機休息室



司機休息室2F柱施作

