

工程成本進度


工程名稱	正覺寺玄奘文化宗教園區開發案
開工日期	112年07月21日
預定完工日期	115年10月03日
施工工期	1171日曆天
累計工期	406日曆天（截至113年08月29日）
剩餘工期	765日曆天
預定進度(113.08.29)	19.97%
實際進度(113.08.29)	19.11%
本週進度(超前/落後)	0.86%



正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景



正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景

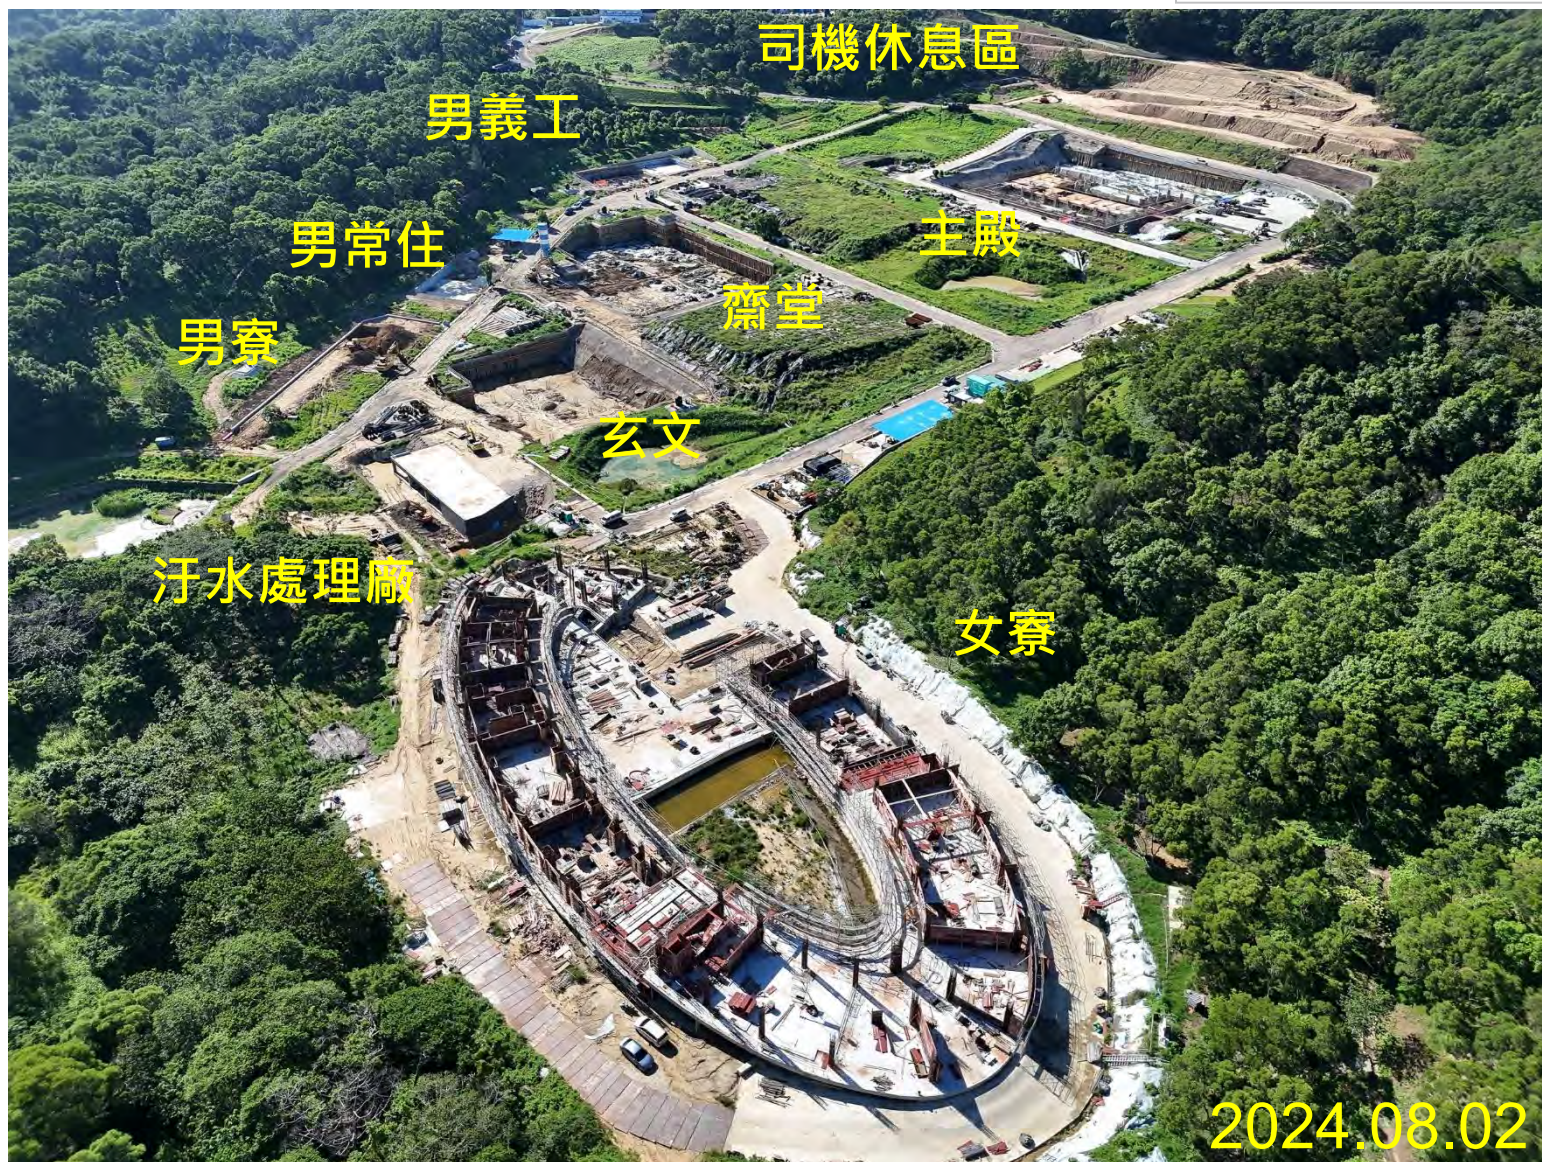

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景




正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景



主殿



女寮

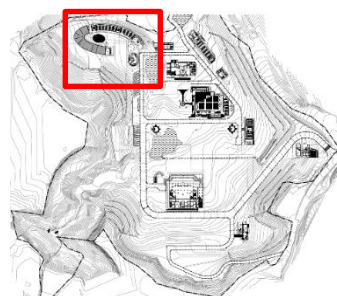




齋堂




玄文

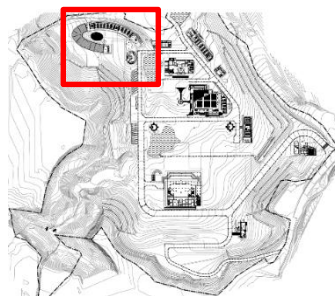




男義工

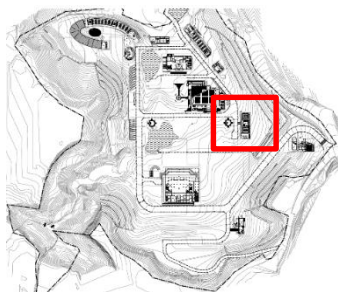

男常住

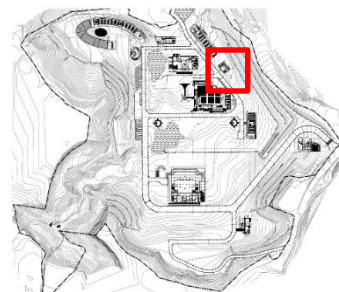




主殿B2F鋼筋模板、機電施作





主殿B2F鋼筋模板、機電施作

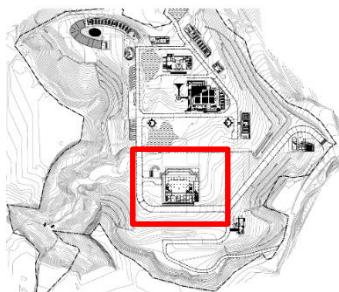



女寮2區2F柱牆鋼筋、模板、水電施作
2-2區1F施作

女寮1區1F柱牆鋼筋、模板、水電施作

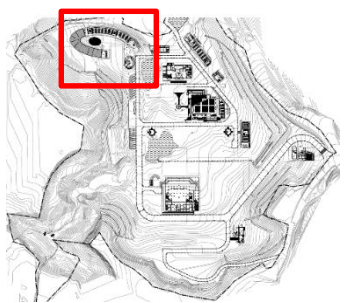
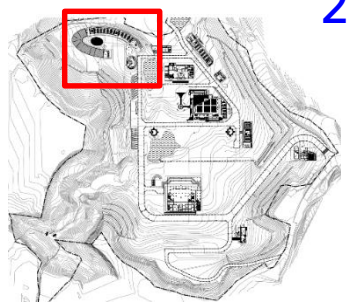




玄文第三層土方開挖



齋堂第三層土方開挖細整、樁頭劣質打除

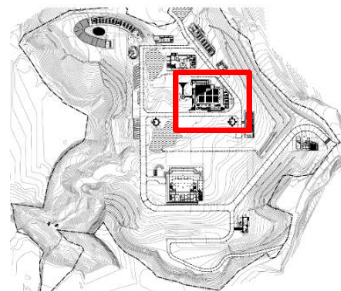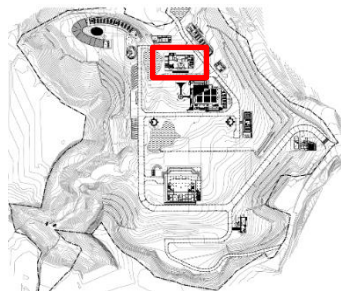




男常住機電接地、土方細整、噴漿護坡



男義工地錨施預力完成、第二階土方開挖

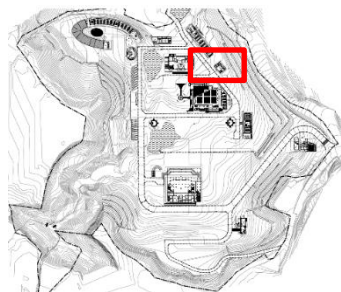

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案



施工照片



主殿




齋堂

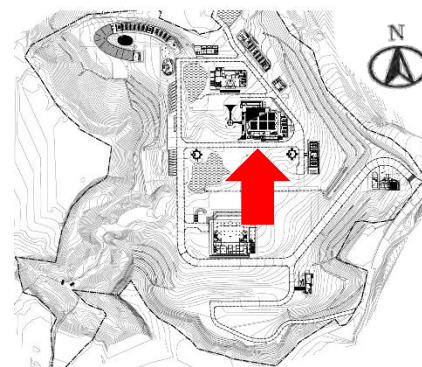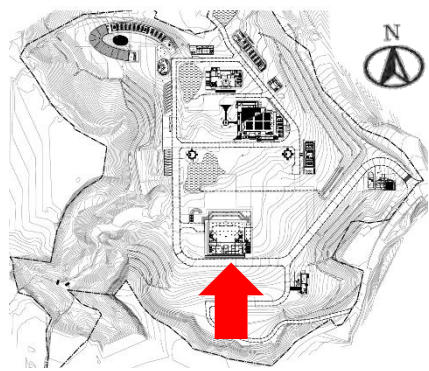




女寮

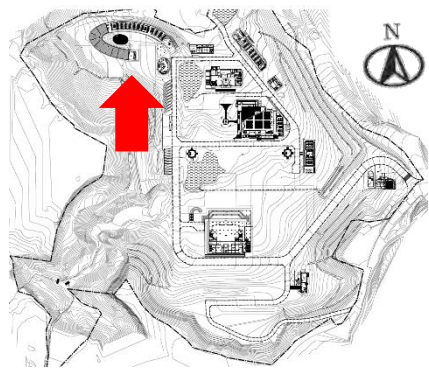

玄文


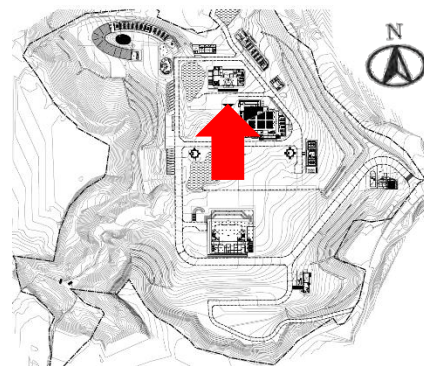




男義工



男常住

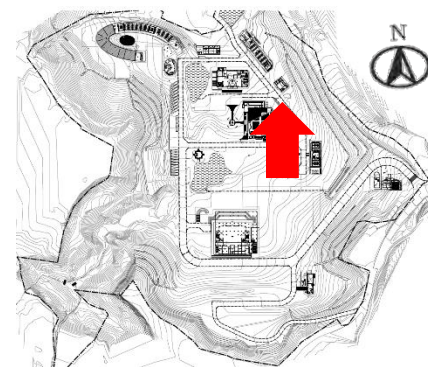
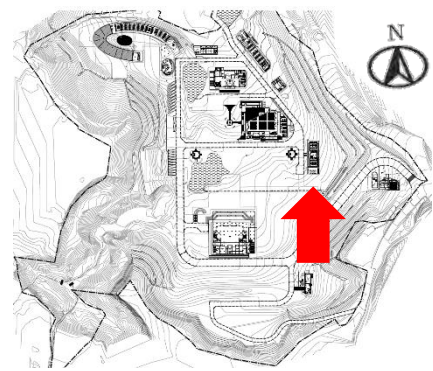




男寮




司機休息室

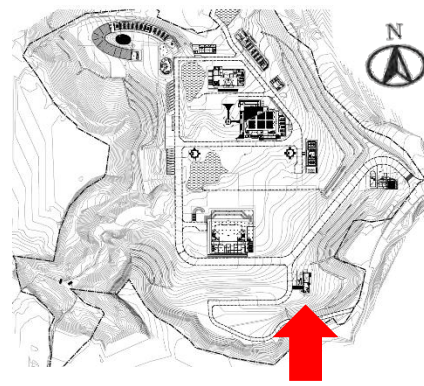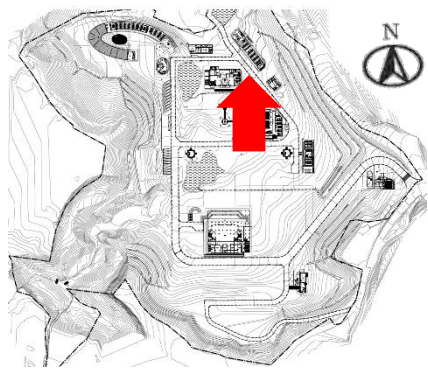




女寮1、3區1F柱牆鋼筋模板水電施作
防颱作業

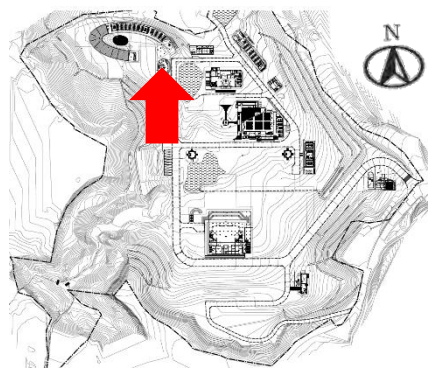

女寮2區2F柱牆鋼筋模板水電施作
防颱作業


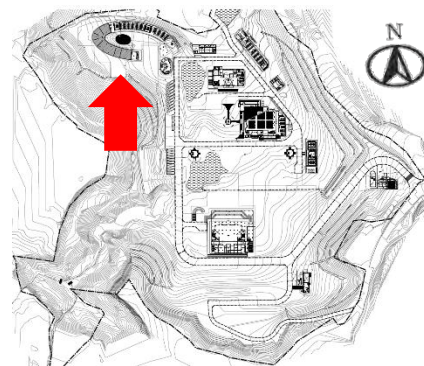




玄文第三階土方開挖、噴漿護坡、
接地施作



男義工基礎層鋼筋綁紮

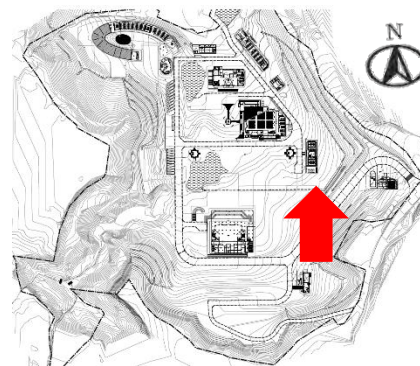
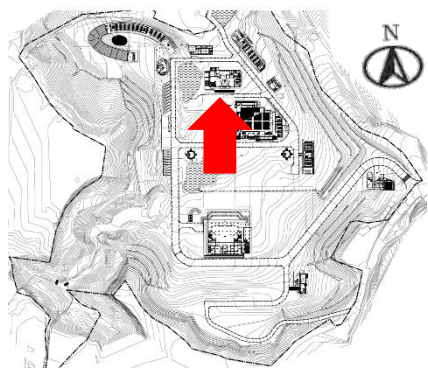




男寮鋼軌樁打設



司機休息室土方開挖

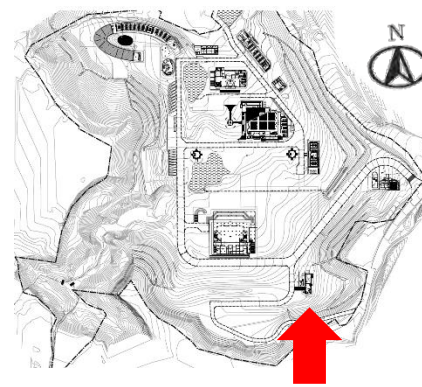
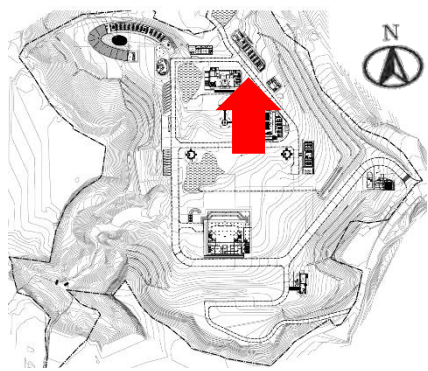




主殿




齋堂

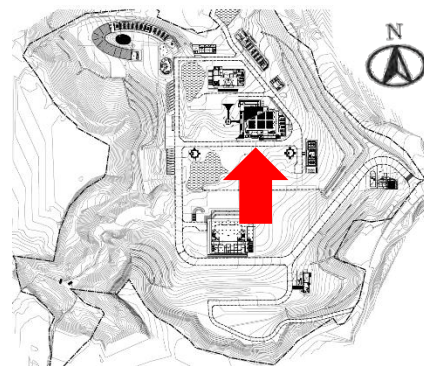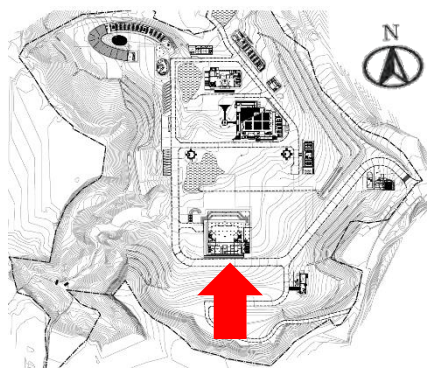




女寮

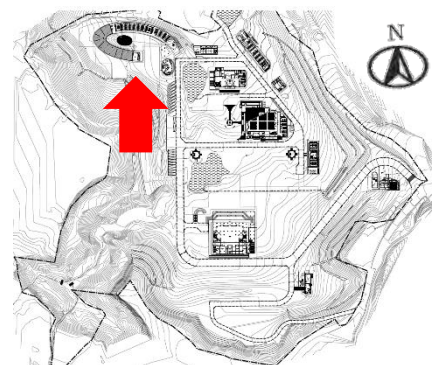

玄文

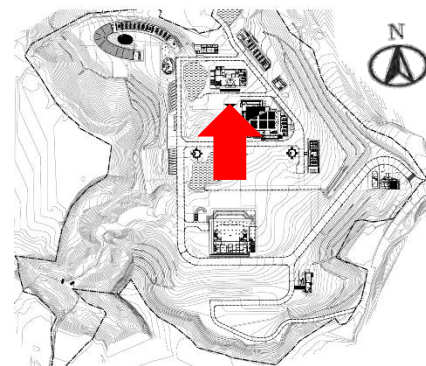

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案



施工照片



男義工



男常住

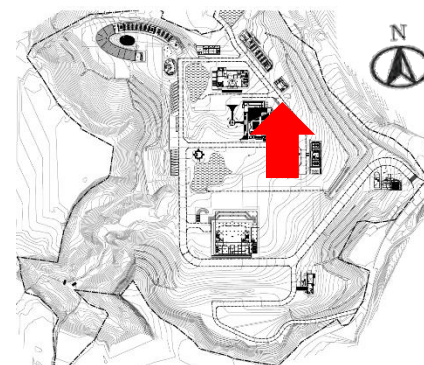
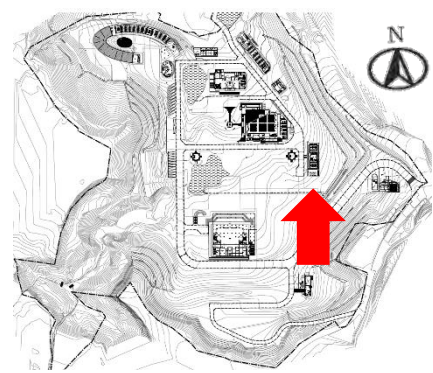




男寮



司機休息室

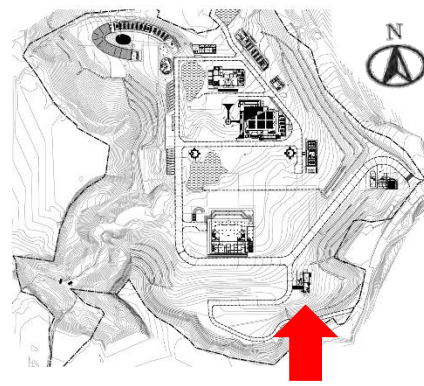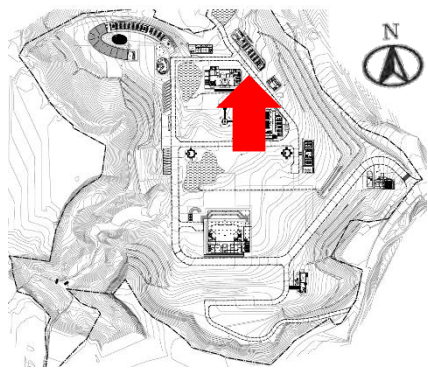

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案



施工照片



女寮1、3區1F柱牆鋼筋模板水電施作



女寮2區2F柱牆鋼筋模板水電施作

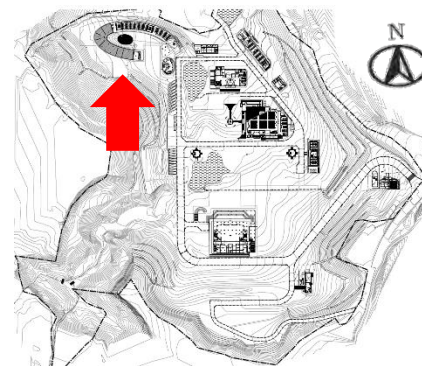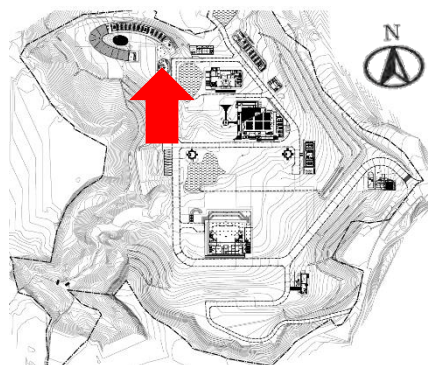

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案



施工照片



主殿1區B2F柱牆、B1F梁版
鋼筋模板水電施作



齋堂基樁補樁

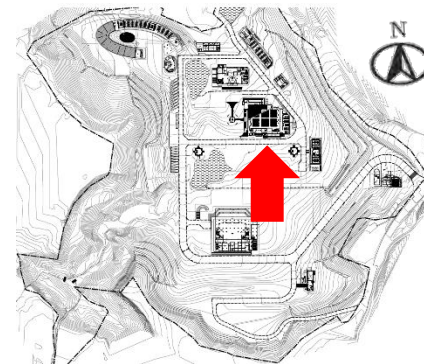
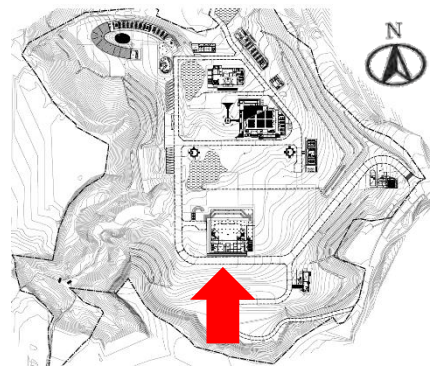




男寮鋼軌樁樁帽、地錨試錨




男義工基礎層鋼筋綁紮

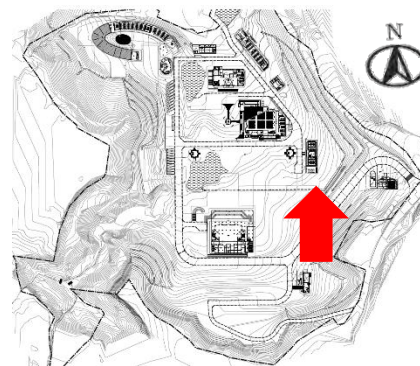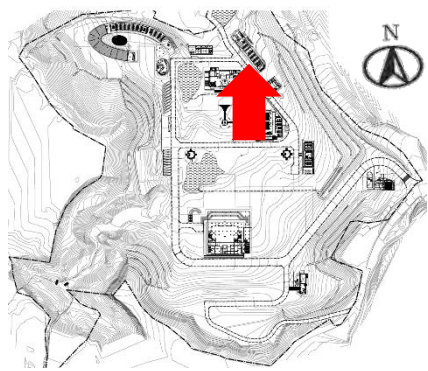

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案



施工照片

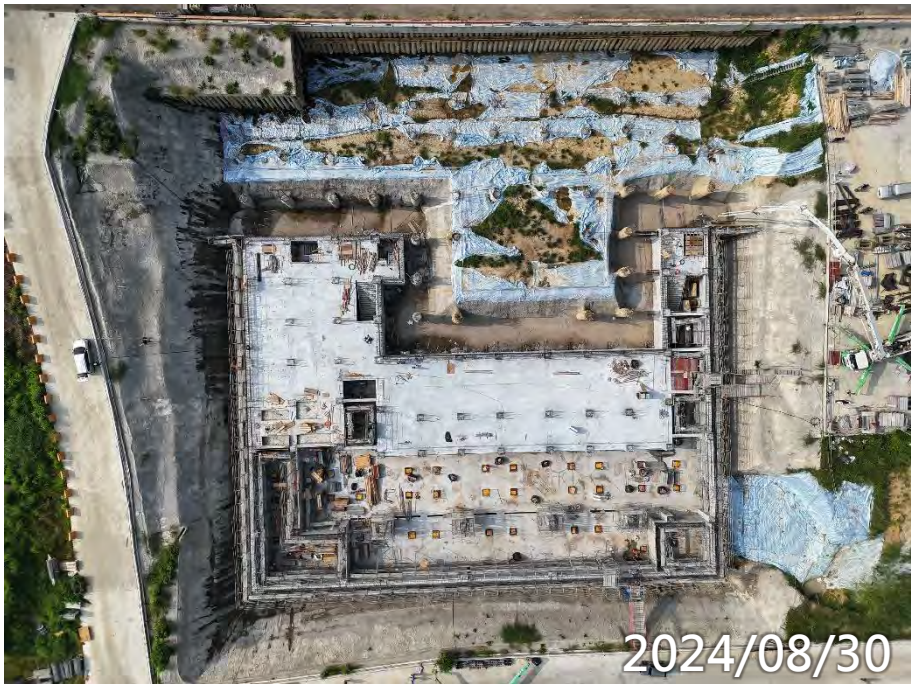

主殿



齋堂

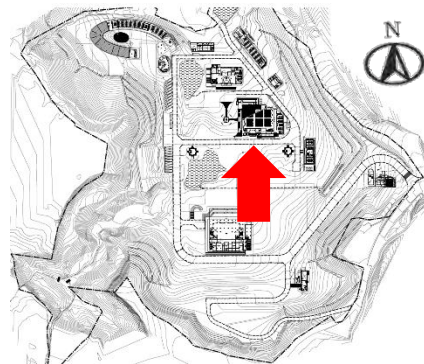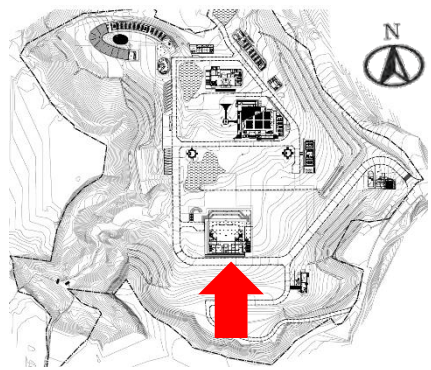

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案



施工照片



女寮




玄文

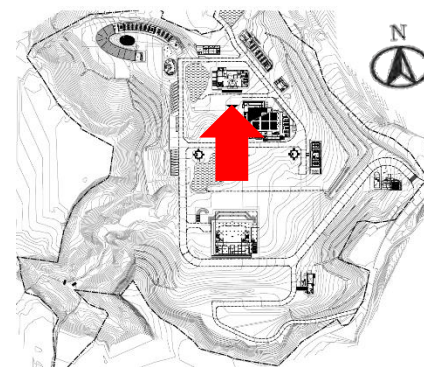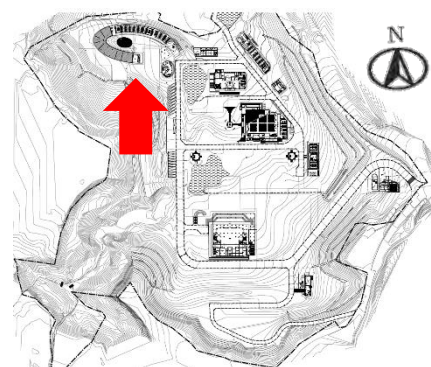

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案



施工照片

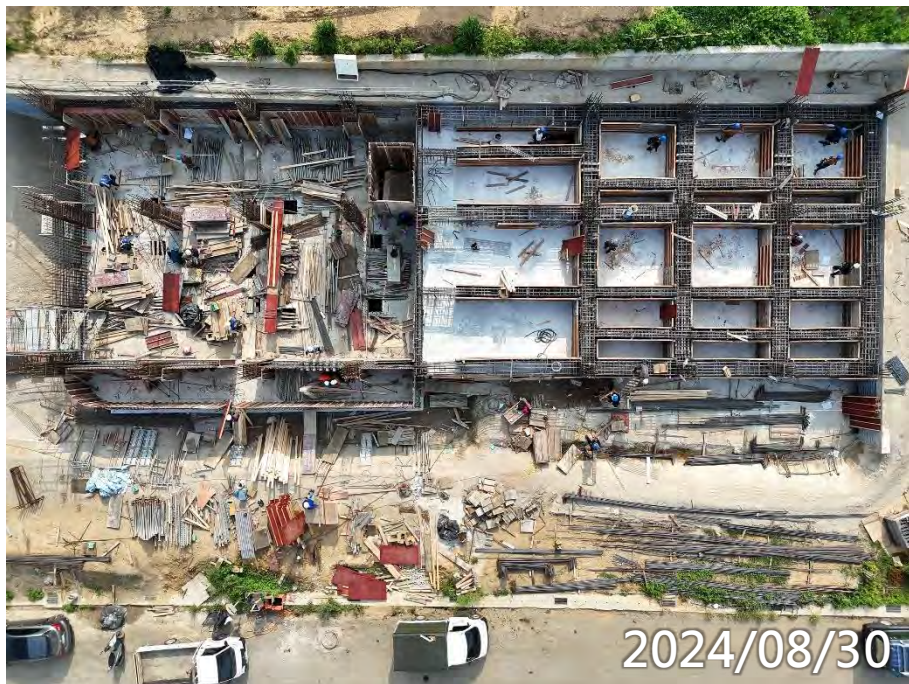

男義工



男常住

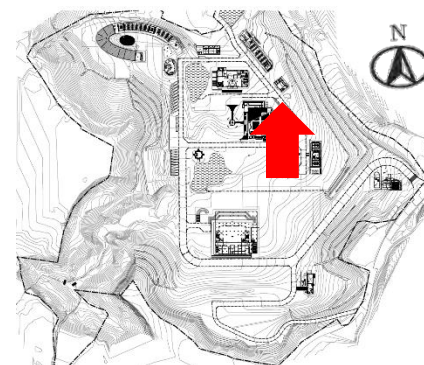
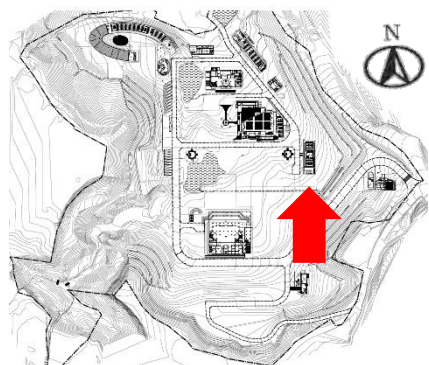




男寮



司機休息室

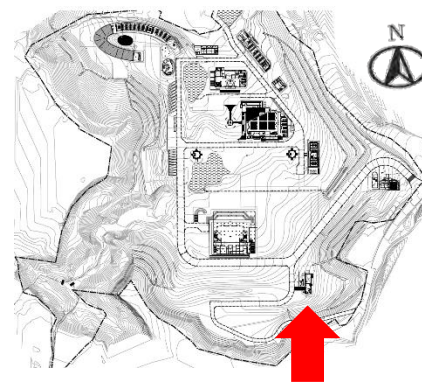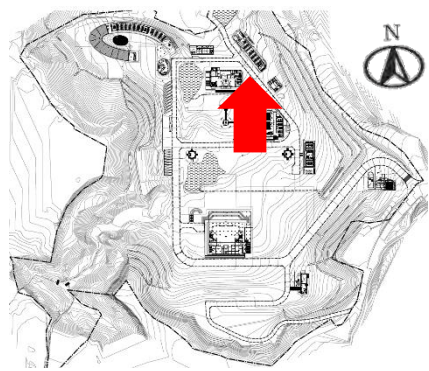


正覺寺玄奘文化宗教園區開發案



施工照片



女寮1、3區2F梁版鋼筋模板水電施作

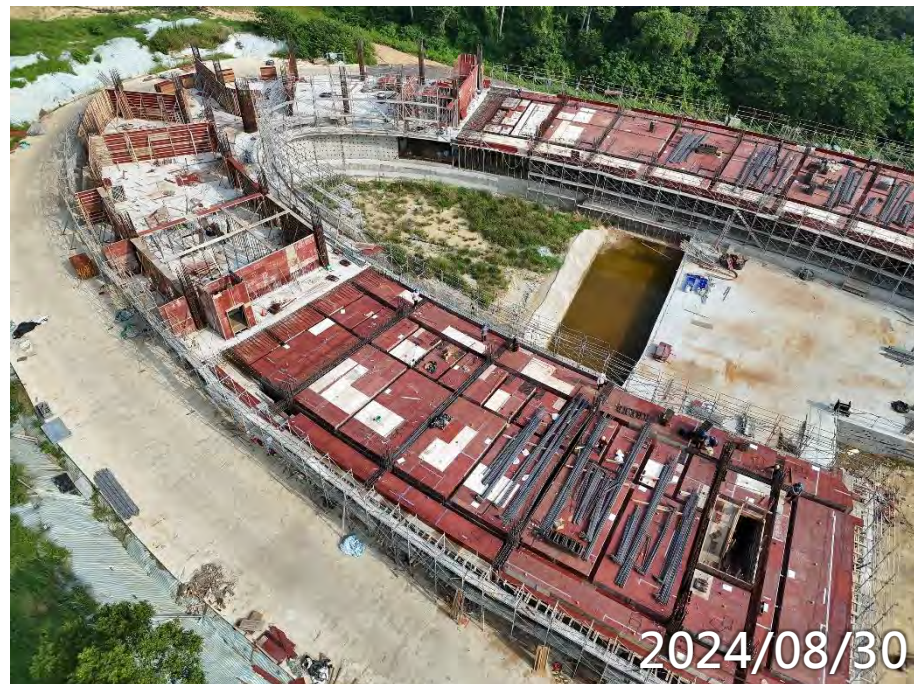

女寮2區2F柱牆鋼筋模板水電施作

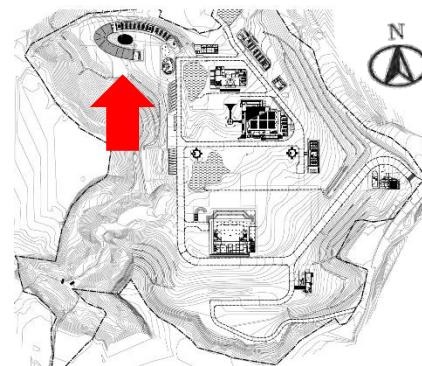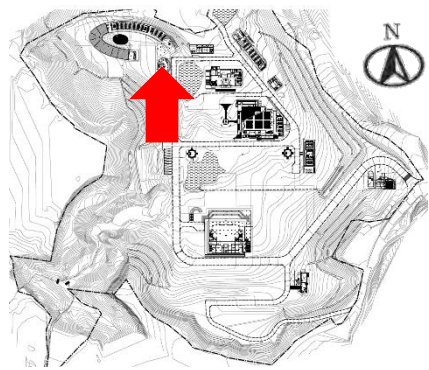

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案



施工照片



主殿1區B1F梁版混凝土澆置




齋堂PC打底

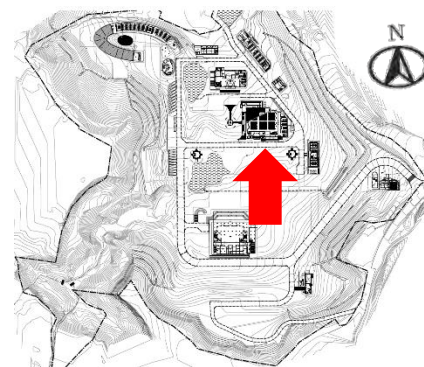
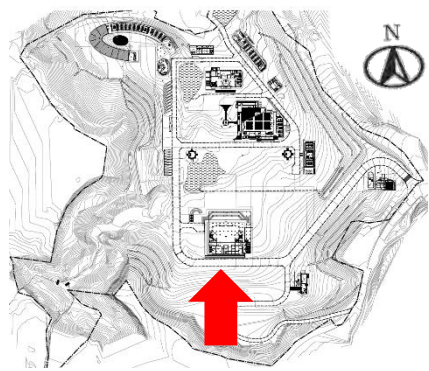





男寮地錨試錨、第一階土方開挖

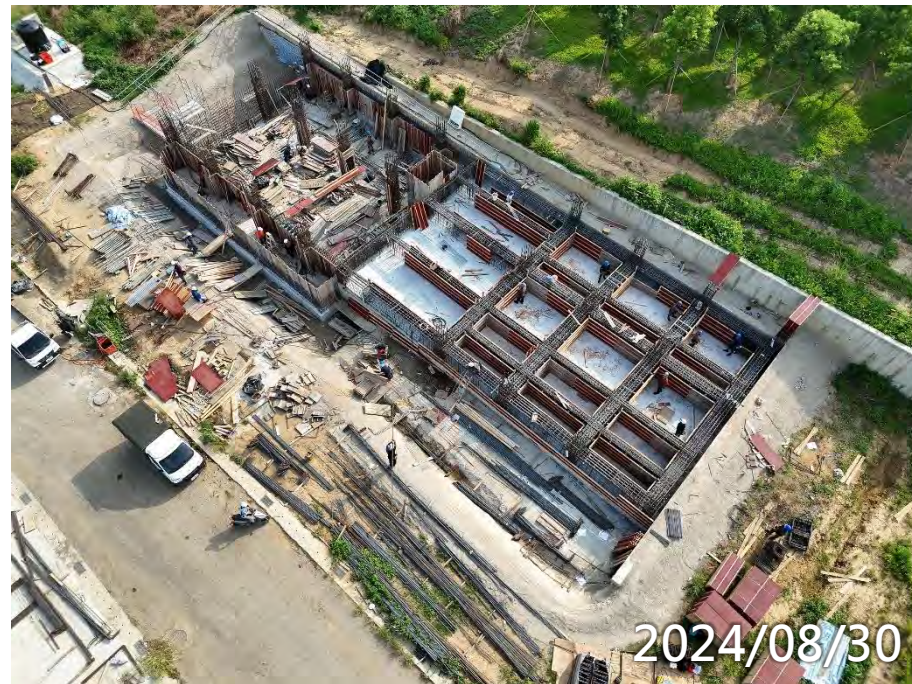

男義工低版區B1F、高版區地梁
鋼筋模板水電施作

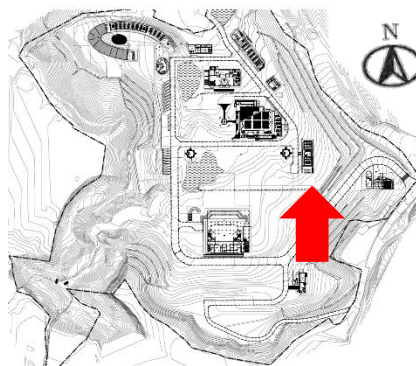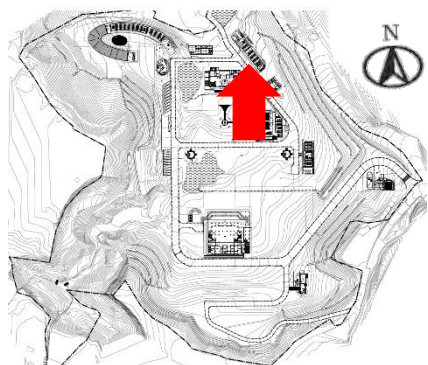

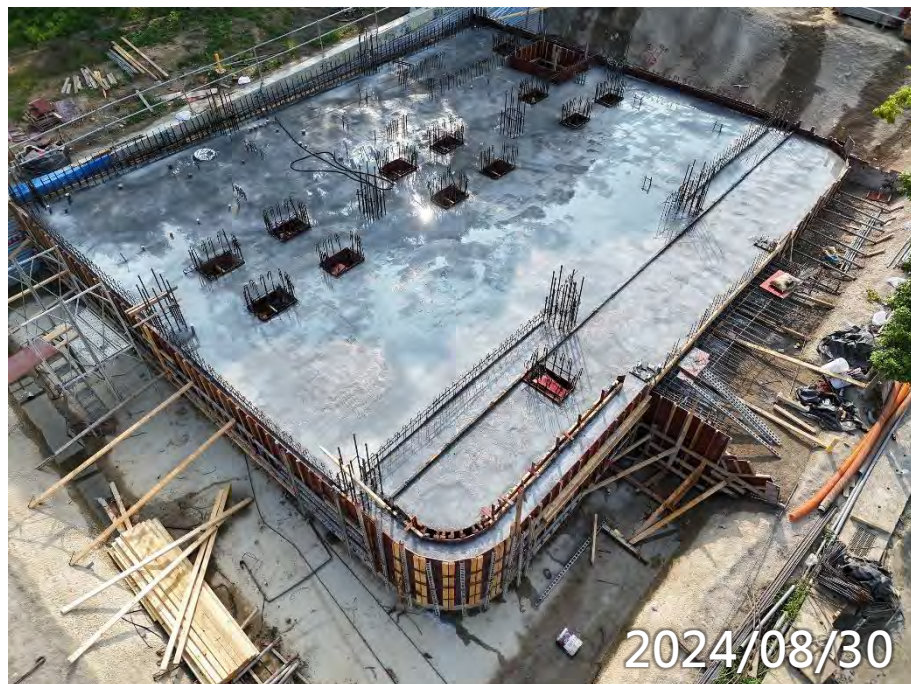

男常住BS版混凝土澆置



司機休息室噴漿護坡

