

# 工程成本進度

工程名稱	正覺寺玄奘文化宗教園區開發案
開工日期	112年07月21日
預定完工日期	115年10月03日
施工工期	1171日曆天
累計工期	406日曆天（截至113年08月29日）
剩餘工期	765日曆天
預定進度(113.08.29)	19.97%
實際進度(113.08.29)	19.11%
本週進度(超前/落後)	0.86%




正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景





正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景



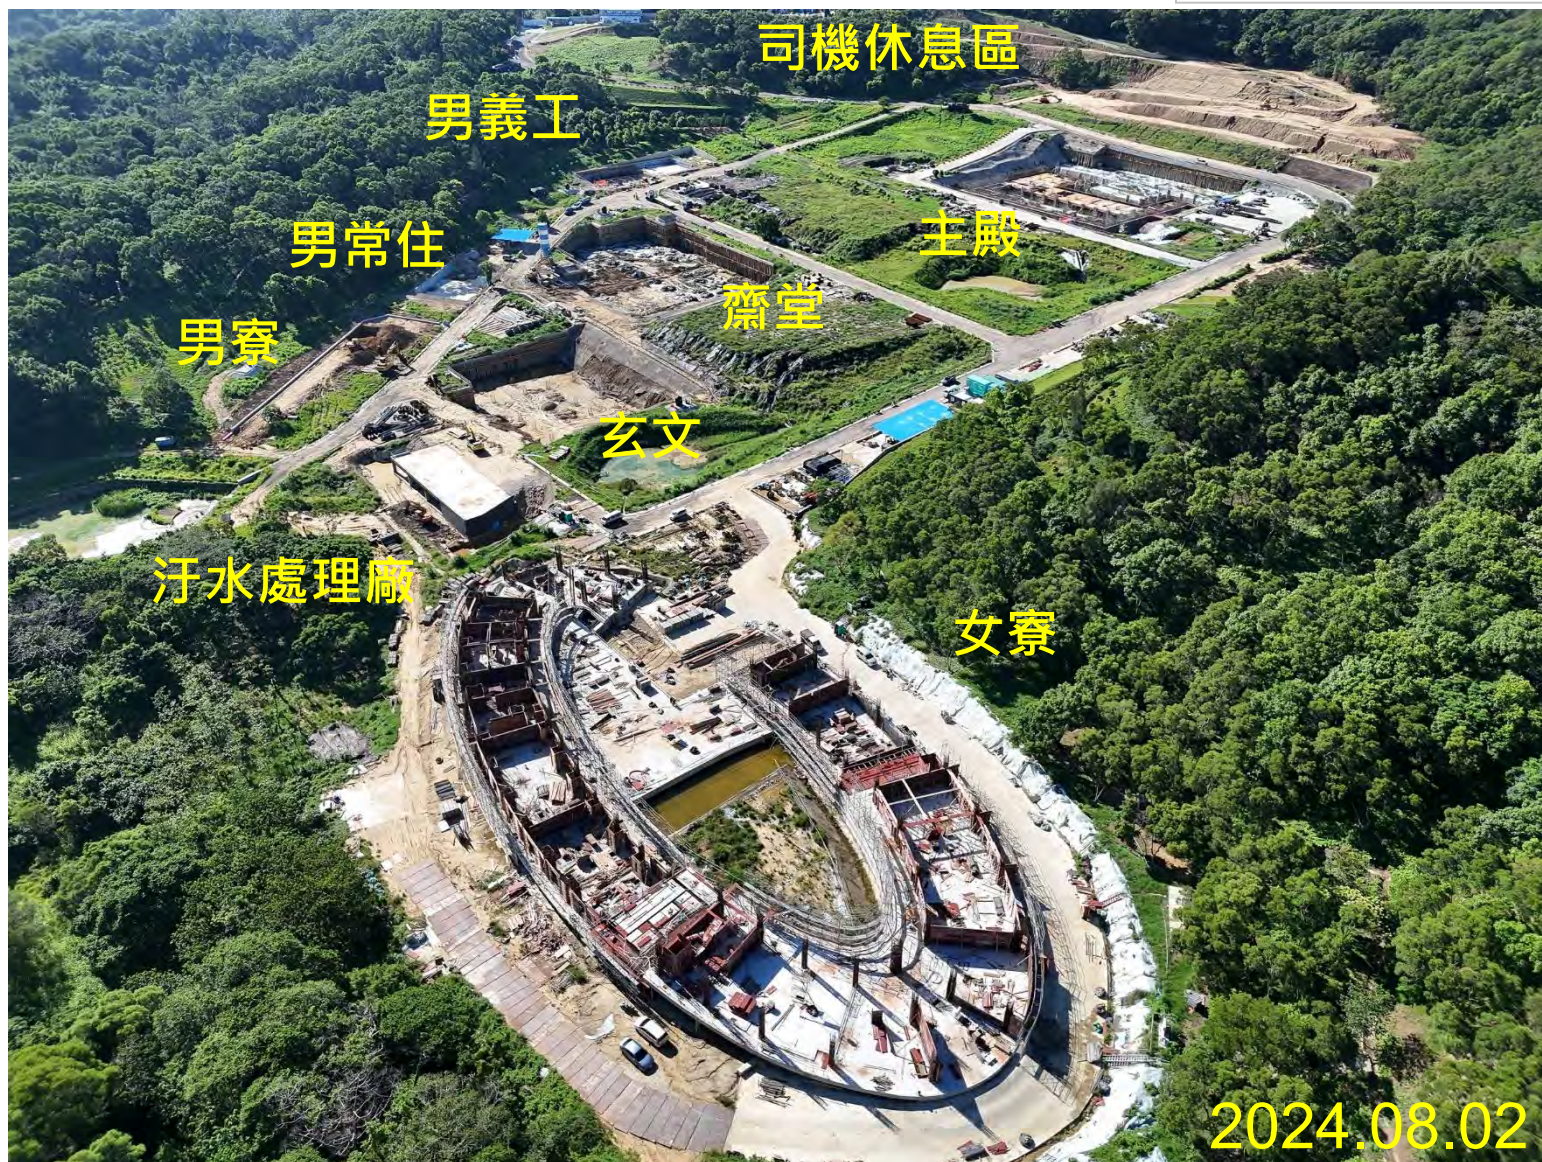

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景






正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景






主殿

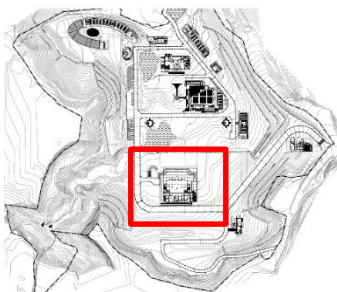


女寮

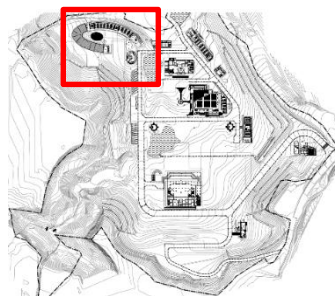





齋堂

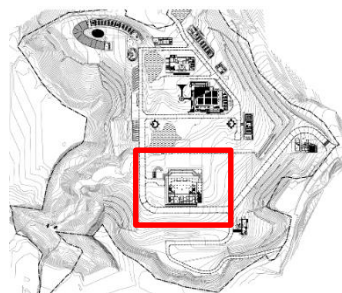

玄文









男義工

男常住

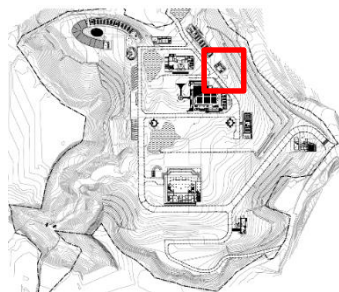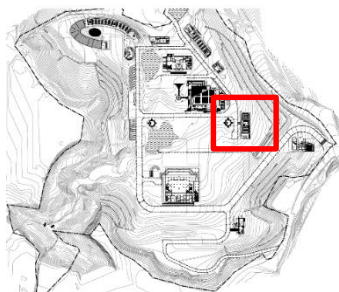






主殿B2F鋼筋模板、機電施作



主殿B2F鋼筋模板、機電施作


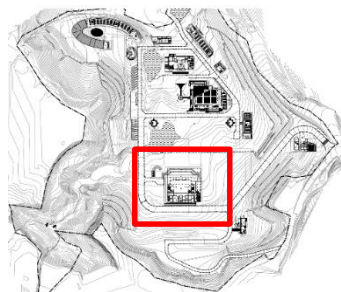






女寮2區2F柱牆鋼筋、模板、水電施作  
2-2區1F施作

女寮1區1F柱牆鋼筋、模板、水電施作

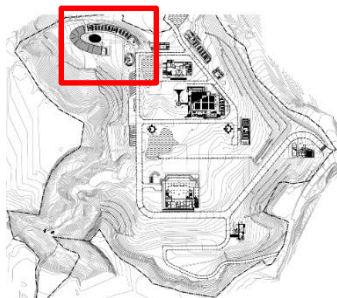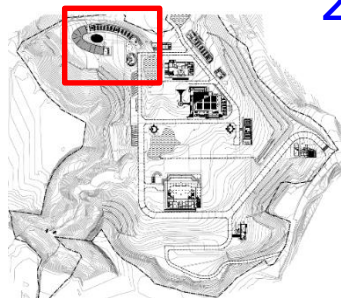







玄文第三層土方開挖



齋堂第三層土方開挖細整、樁頭劣質打除

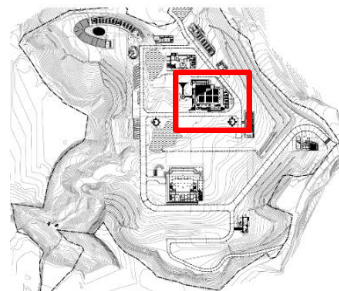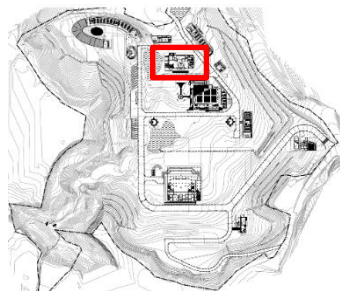







男常住機電接地、土方細整、噴漿護坡



男義工地錨施預力完成、第二階土方開挖

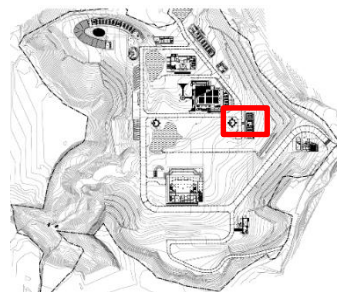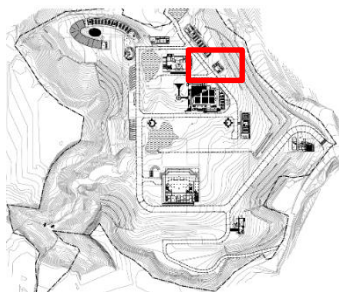



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案



## 施工照片



主殿




齋堂

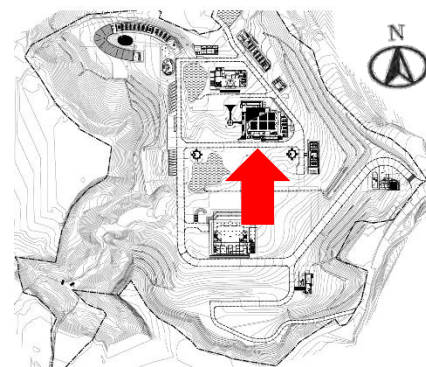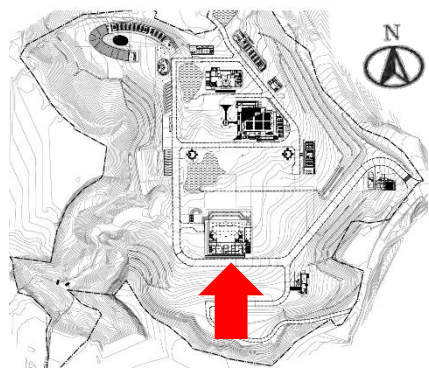






女寮

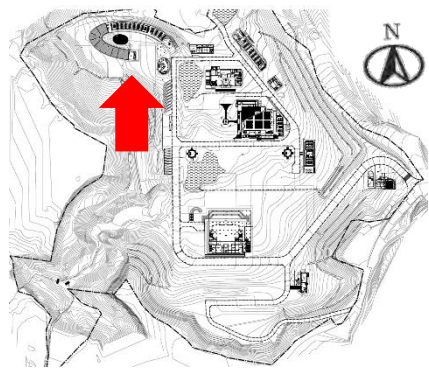

玄文

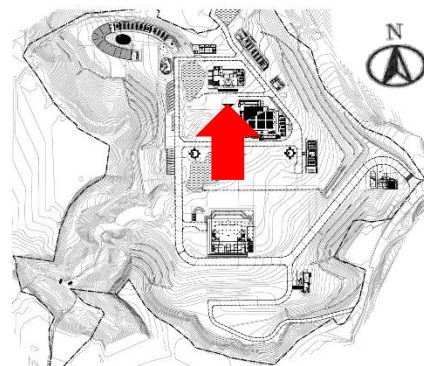



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案



## 施工照片



男義工



男常住

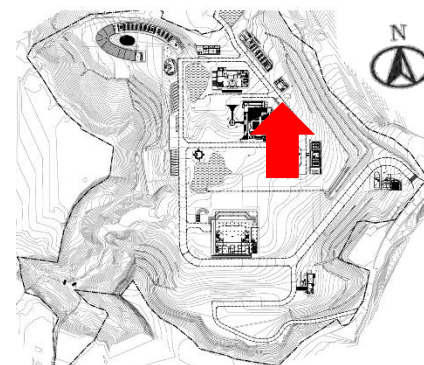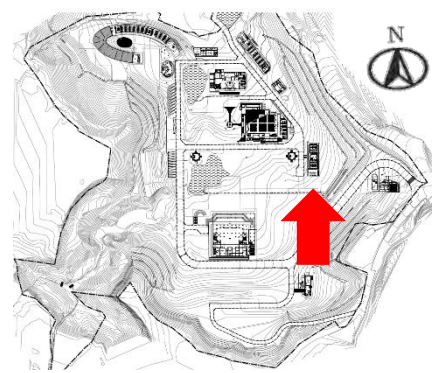







男寮



司機休息室

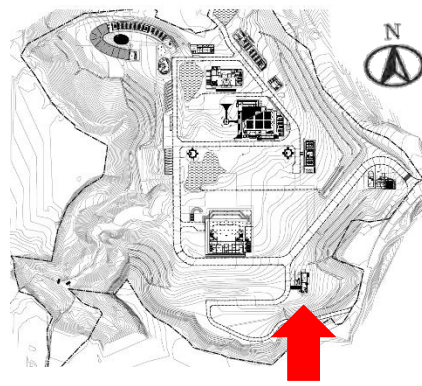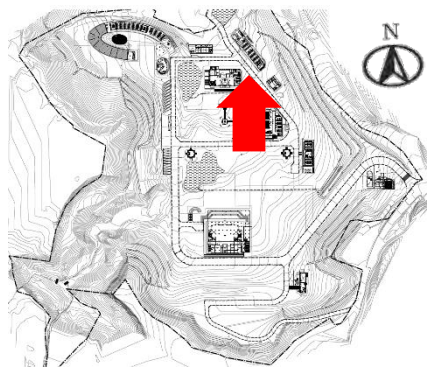







女寮1、3區1F柱牆鋼筋模板水電施作  
防颱作業



女寮2區2F柱牆鋼筋模板水電施作  
防颱作業

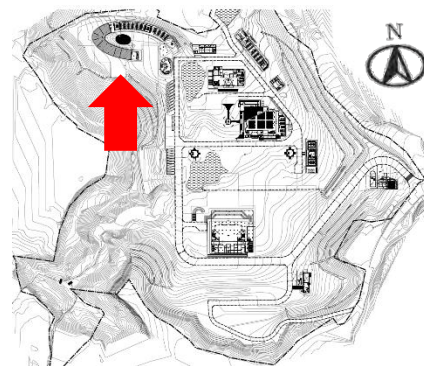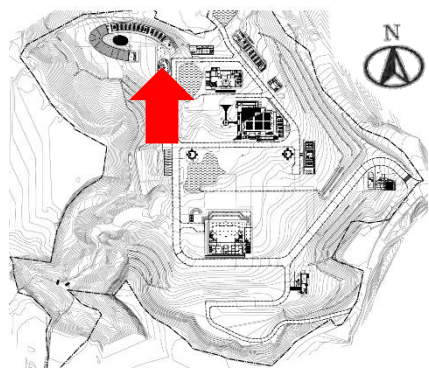







玄文第三階土方開挖、噴漿護坡、  
接地施作



男義工基礎層鋼筋綁紮

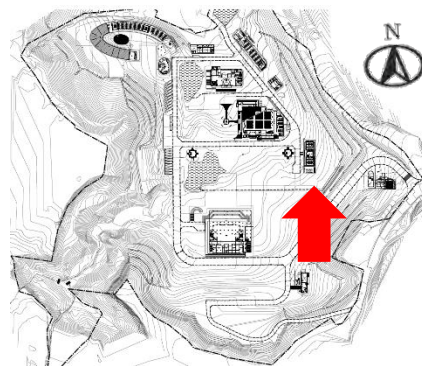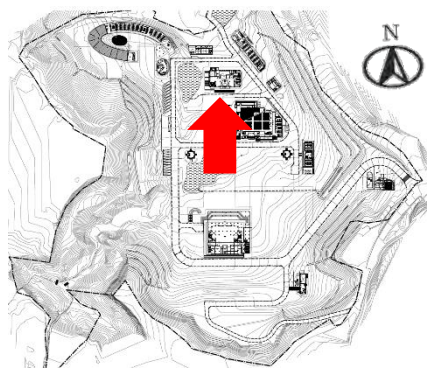







男寮鋼軌樁打設



司機休息室土方開挖

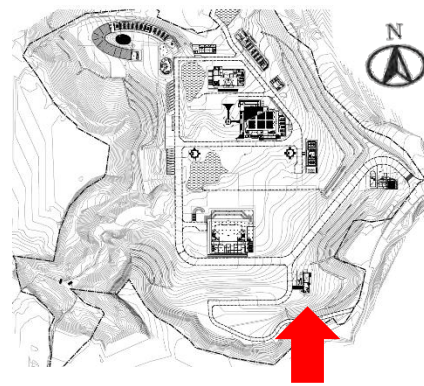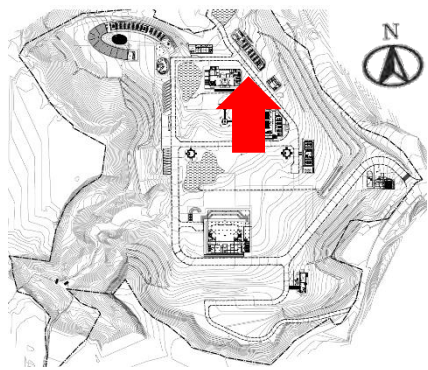







主殿




齋堂

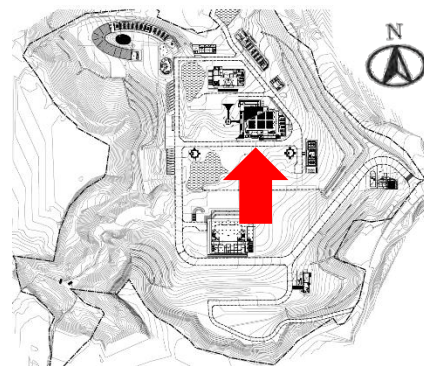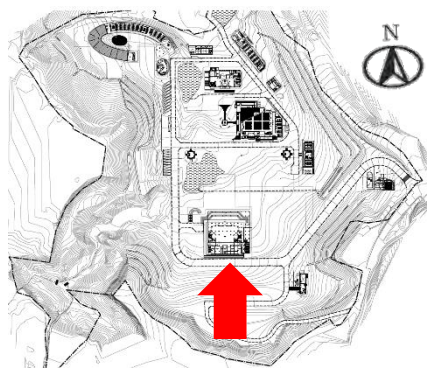






女寮

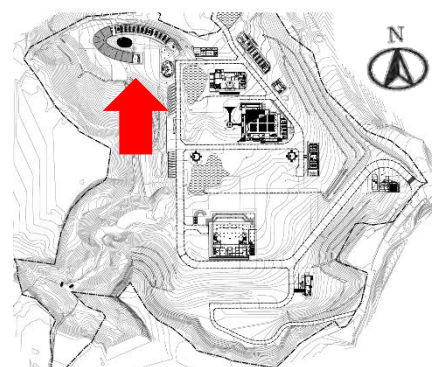

玄文

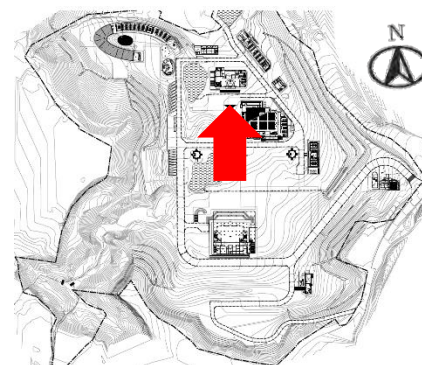



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案



## 施工照片



男義工



男常住

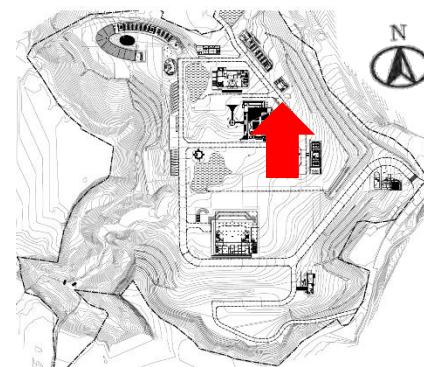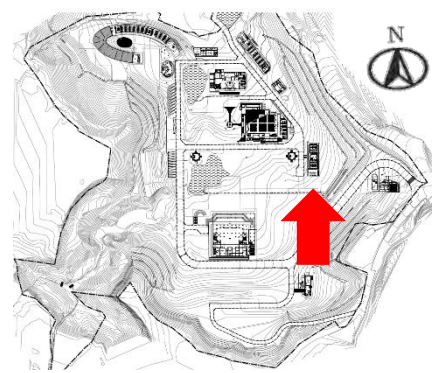







男寮



司機休息室

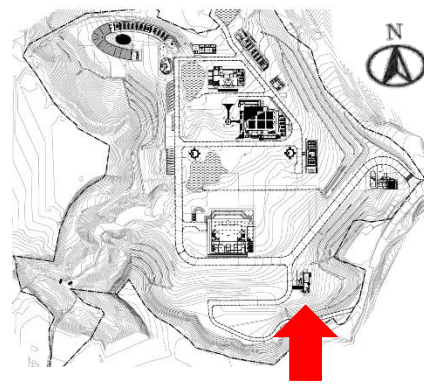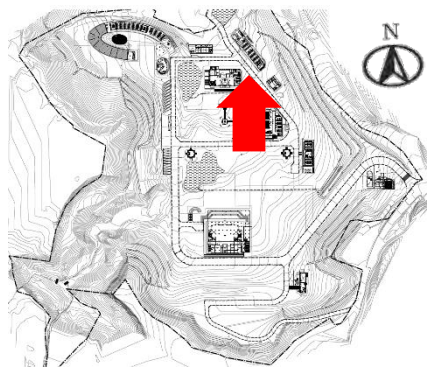



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案



## 施工照片




女寮1、3區1F柱牆鋼筋模板水電施作



女寮2區2F柱牆鋼筋模板水電施作

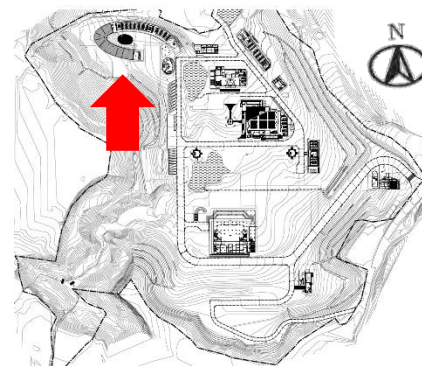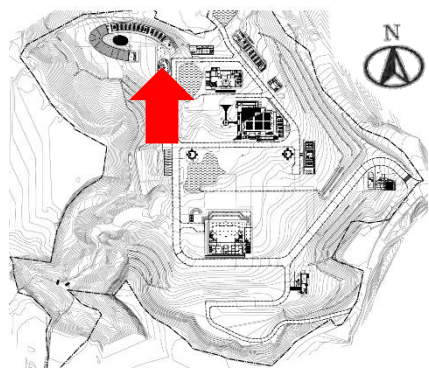





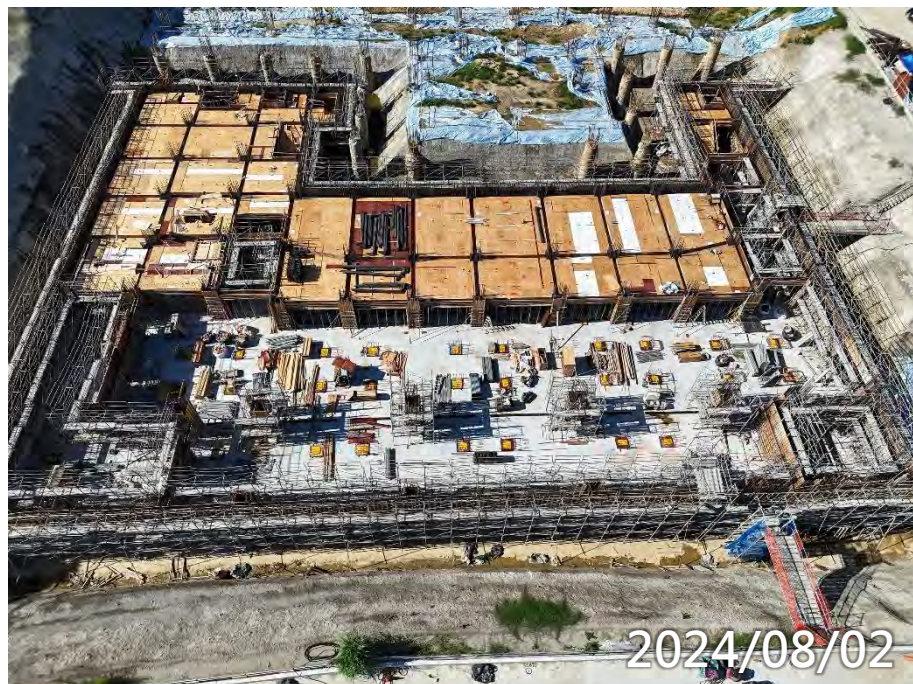

主殿1區B2F柱牆、B1F梁版  
鋼筋模板水電施作



齋堂基樁補樁

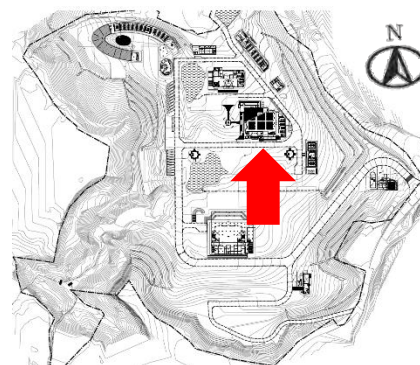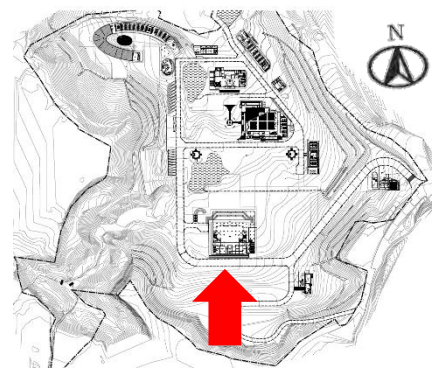








男寮鋼軌樁樁帽、地錨試錨



男義工基礎層鋼筋綁紮

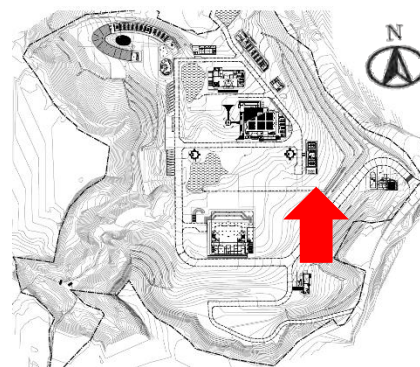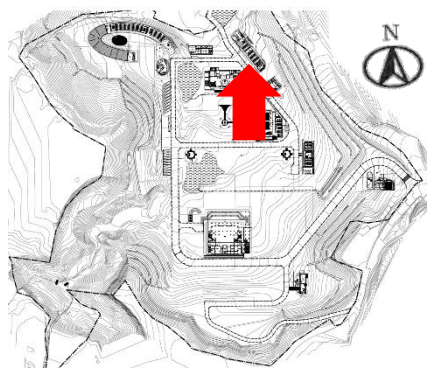





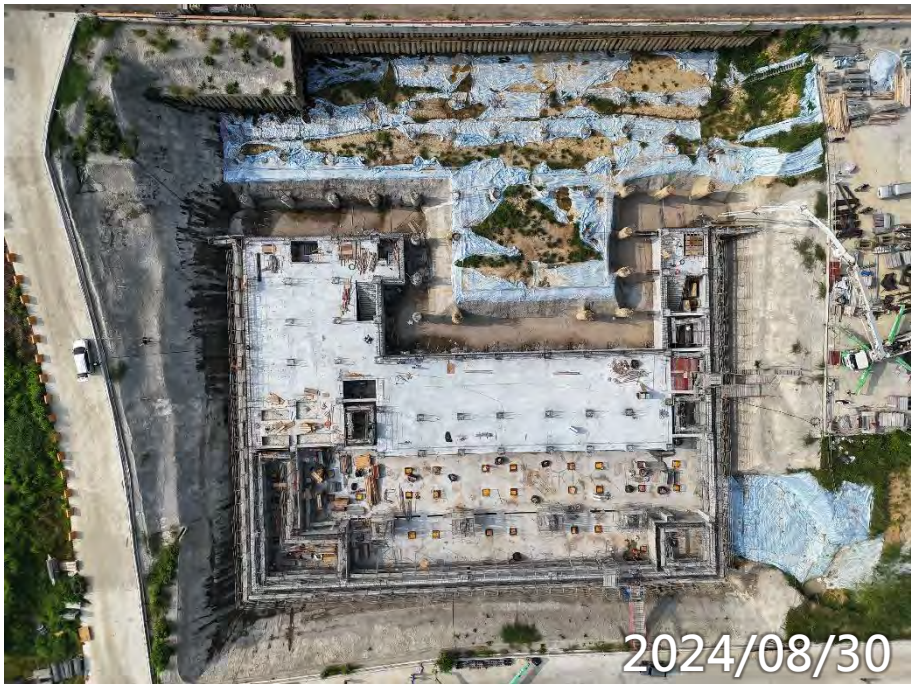

主殿



齋堂

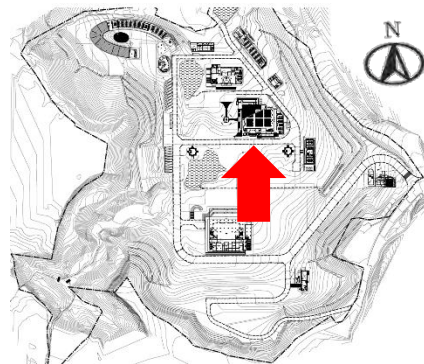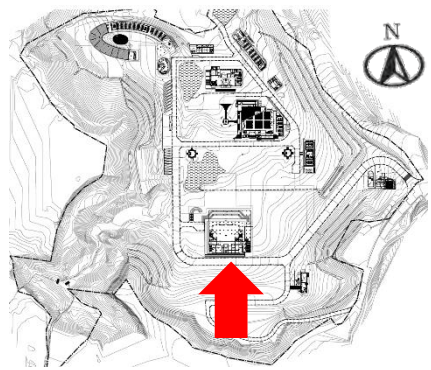



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案



## 施工照片



女寮




玄文

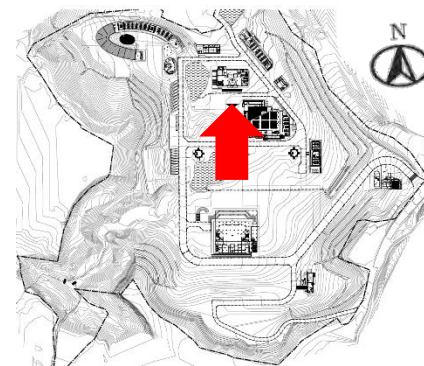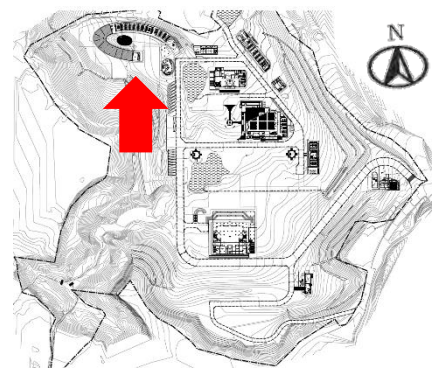



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案



## 施工照片

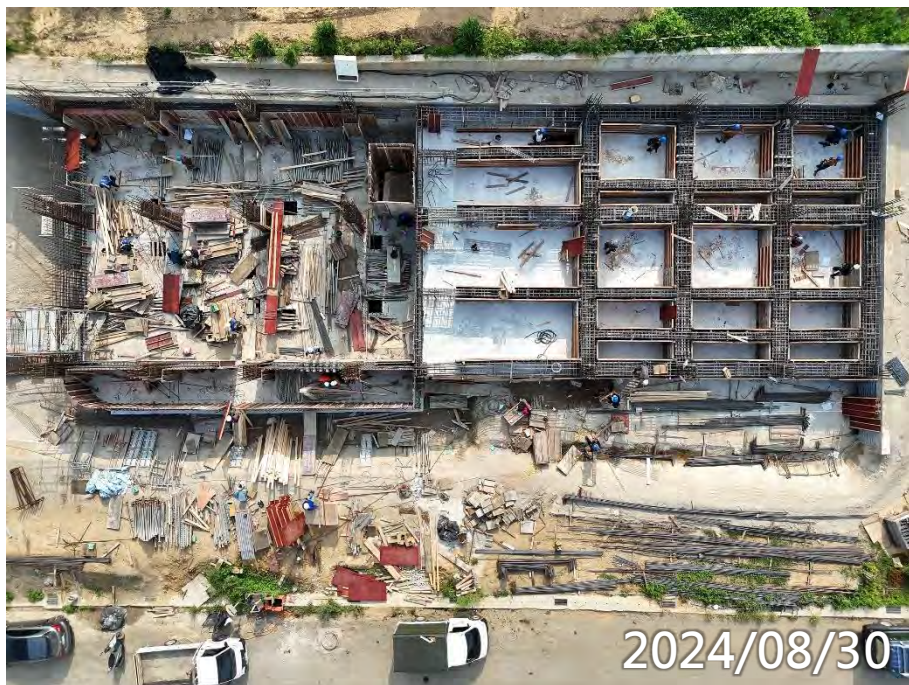

男義工



男常住

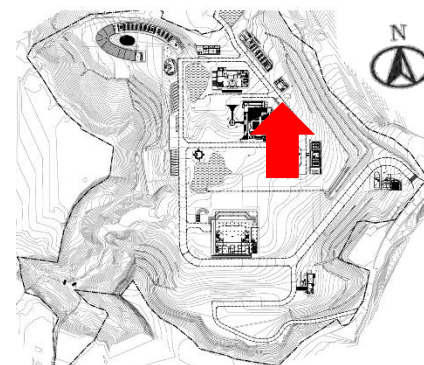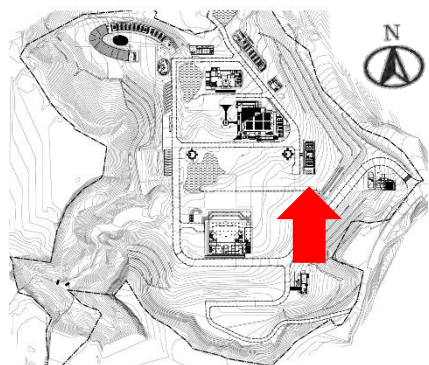







男寮



司機休息室

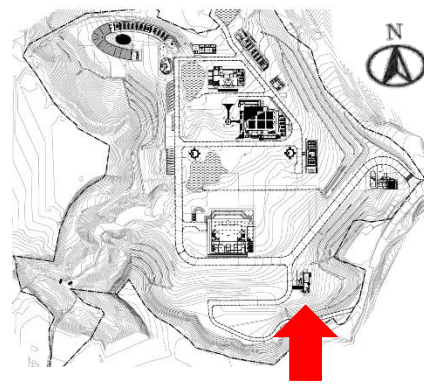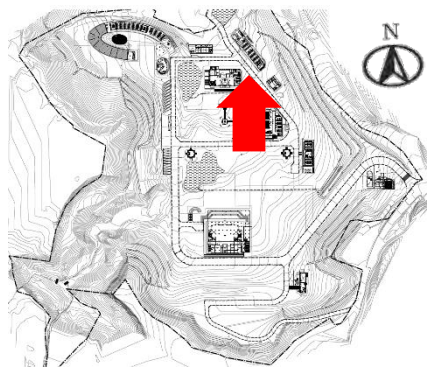




# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案



## 施工照片



女寮1、3區2F梁版鋼筋模板水電施作

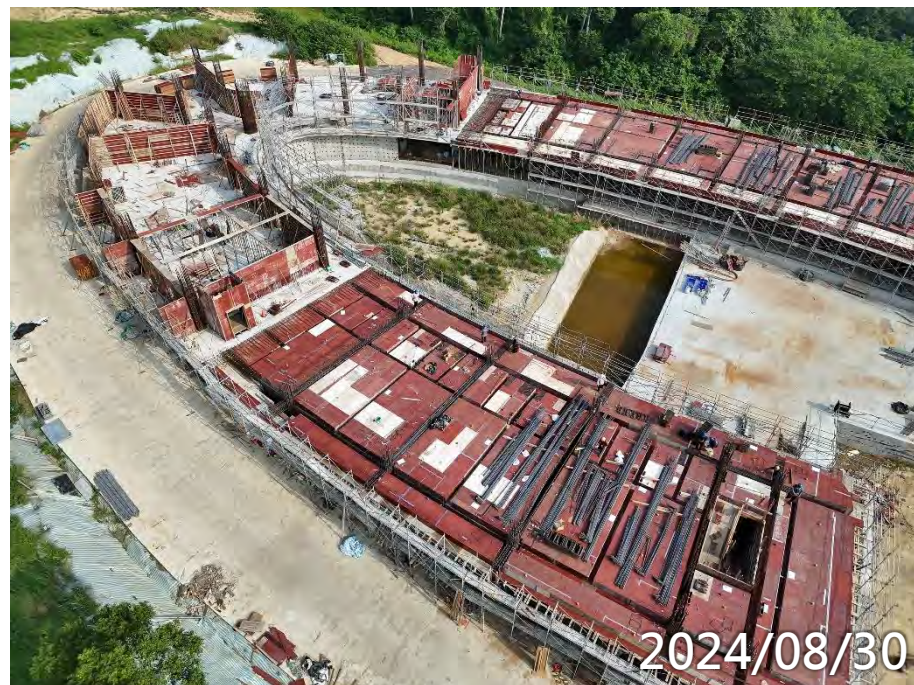

女寮2區2F柱牆鋼筋模板水電施作

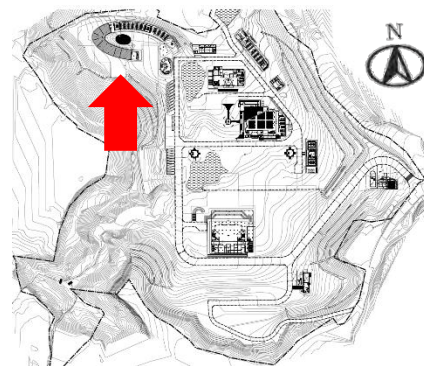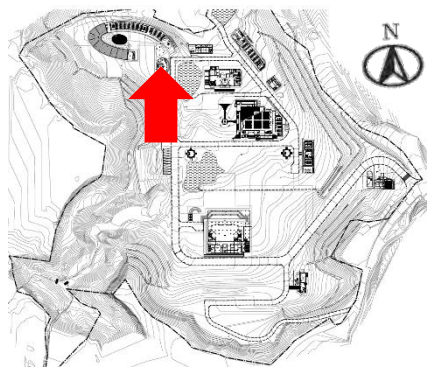



# 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案



施工照片



主殿1區B1F梁版混凝土澆置




齋堂PC打底

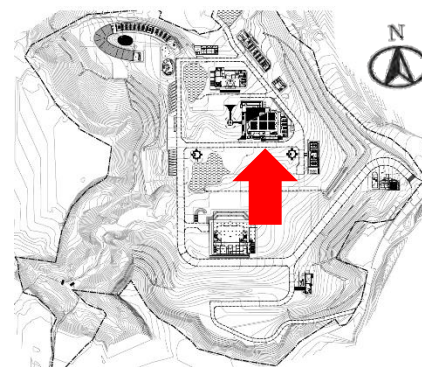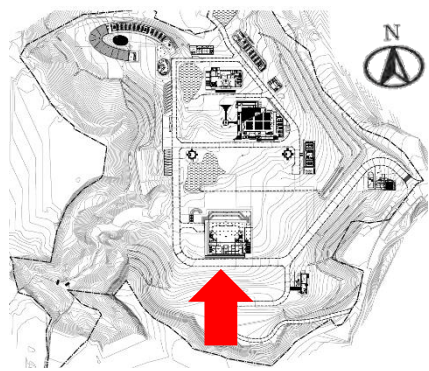








男寮地錨試錨、第一階土方開挖

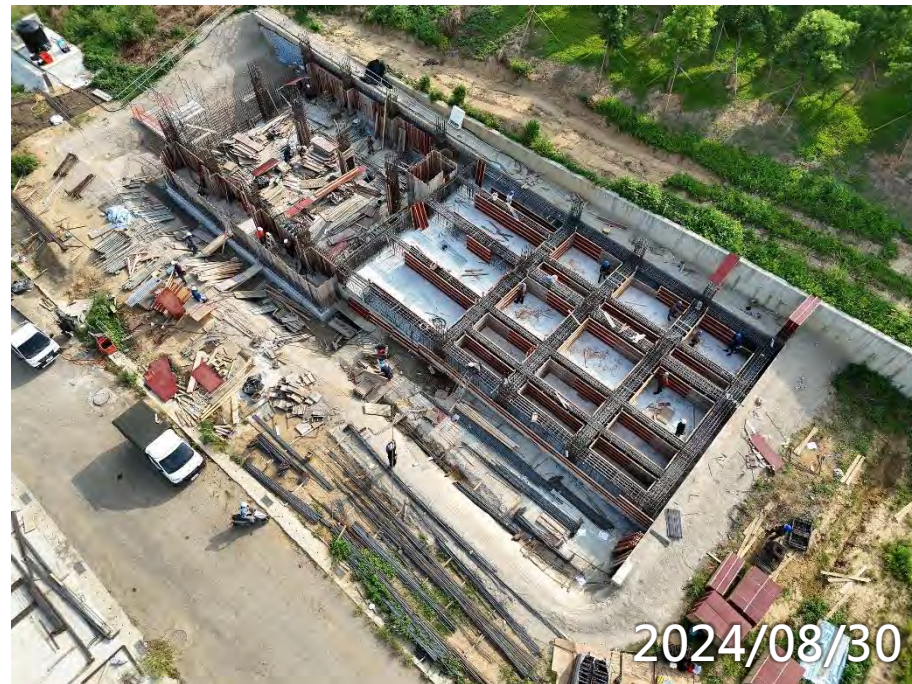

男義工低版區B1F、高版區地梁  
鋼筋模板水電施作

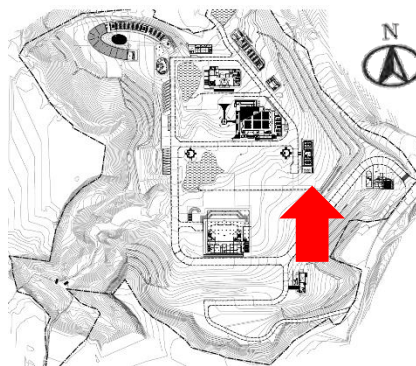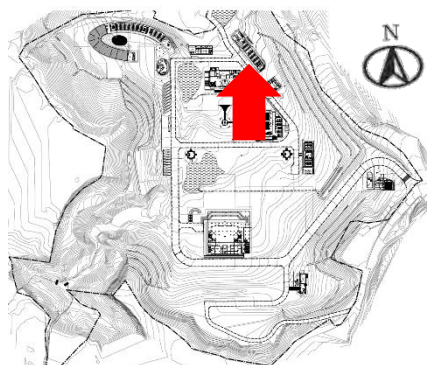



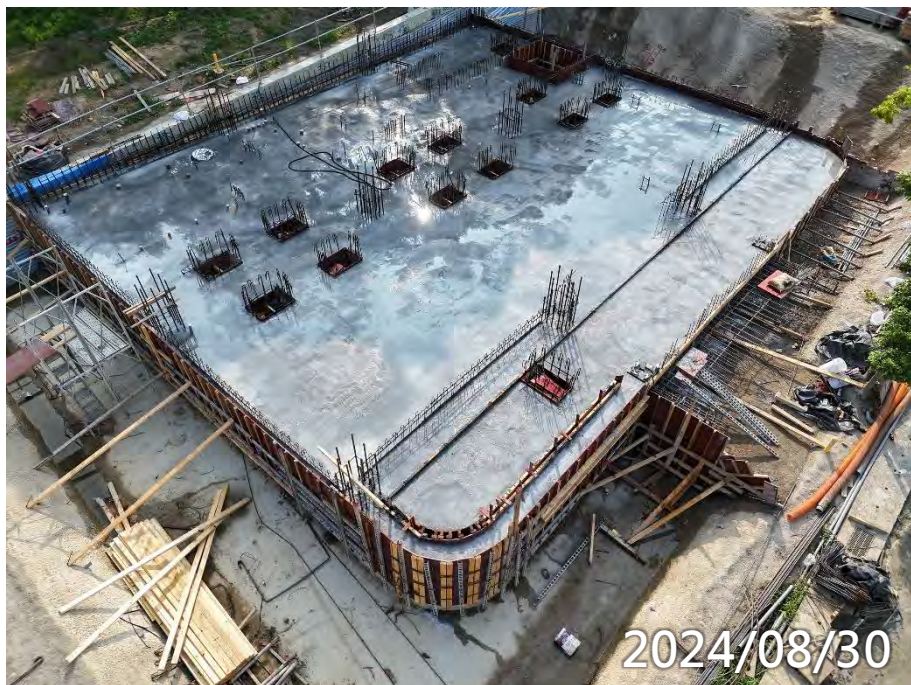

男常住BS版混凝土澆置



司機休息室噴漿護坡

